

на кандидата: "Стратбилд" ЕООД


Обект: „Изграждане на спортна площадка с размери 20/30 ул. „Батановци“

нахождение: гр. Перник

### ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ВИДОВЕТЕ СМР

Вид СМР	Ед. м.	К-во	Норма време		Чдн	Бр. раб.	Дни	Календарни дни																	
			НВр	НВр. Общо				Месец 1																	
								Седмица 1							Седмица 2							Седм			
			1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
рязаване на асфалтова настилка	м	198,00	0,08	15,44	2	1	2	1																	
избиване на асфалтова ивица	м3	2,50	6,70	16,75	2	2	1	2																	
вишинен изкоп за подравняване на терена d=20cm	м3	15,00	-	-	-	-	-																		
разтоварване и извозване на земни маси и асфалтови отломки	м3	17,50	0,30	5,25	1	1	1			1															
ставка и монтаж на армировка за стоманобетонен пояс по контура на площадката	кг	789,00	0,07	55,23	7	3	2					3	4												
изправа и разваляне на кофраж за оформяне на борд с Н=30см. над терена и см.под терена	м2	158,40	0,80	126,72	16	4	4			4	4	4					2	2							
полагане на ПВЦ тръби ф75 в кофража за отводняване на насаipa	бр	16	0,21	3,36	0	1	0					1													
полагане на бетон В20 за ст.б.пояс	м3	20,00	2,80	56,00	7	4	2						3	4											
работка и монтаж в пресен бетон на закладни планки 150/150/4мм. за армиране на стоманени колове	бр	50	0,50	25,00	3	2	2							2	1										
ставка и монтаж на стоманени колове от кухи профили 60/60/3мм. с дължина 1м. (50бр)	кг.	997,00	0,35	348,95	44	6	7		6	6	6					6	6	7							
ставка и монтаж на междинни стоманени колове от кухи профили 40/40/2мм. с дължина 2м. (100бр)	кг.	460,00	0,35	161,00	20	3	7										3	3							
ставка и монтаж на кухи стоманени профили 60/60/3мм., Зреда хоризонтално височини 0.1м, 2м. и 4м.- L=297m	кг.	1481,00	0,35	518,35	65	5	13						5	5	5										
ставка и монтаж на диагонали 60/60/3мм в ълите между коловете - 16бр.	кг	232,00	0,35	81,20	10	2	5																		
изправа и монтаж на два бр. врати от кухи стоманени профили 50x50x3мм. и въвръдна мрежа с отвори 50x50/3 мм. с ПВЦ покритие	кг	90,00	0,35	31,50	4	2	2											2							
изправа на фундаменти за монтаж на футболни врати.	бр	4,00	3,84	15,36	2	2	1							2											
ставка, разтоварване и разстилане на чакъл върху подравнена земна основа с дебелина на пласта 20см.	м3	115,05	1,90	218,60	27	5	5						5	5	5	5	5	2							
амбование на чакъл	м2	575,25	-	-	-	-	-																		
ставка, разтоварване и разстилане на пясък (нулева фракция)върху алнатата маса с дебелина на пласта 10см. и подравняване	м3	57,53	1,90	109,31	14	5	3									5	5	4							
амбование на пясъчна подложка	м2	575,25	-	-	-	-	-																		
участване и боядисване на стоманени профили с боя за метал 3в1	м2	167	0,25	41,73	5	2	3			2	2														
ставка и монтаж на оградна мрежа с полимерно покритие, от тел с отвори x50, ф3,0мм. черен(ф4,5мм с ПВЦ), чрез армировъчни пръти №8 заварени към стоманените профили с точкови заварки през 100см.	м2	96,00	1,10	105,60	13	5	3																		
ставка и монтаж на оградна мрежа с полимерно покритие, от тел с отвори x50, ф3,0мм.	м2	319,80	1,10	351,78	44	5	9																		
ставка и полагане на изкуствена трева - 4см. вкл. посипване с кварцов пясък умени гранули	м2	575,25	0,35	201,34	25	5	5																		
ставка и монтаж на футболни врати	бр.	2	8,00	16,00	2	2	1																		
					<b>311</b>			9	7	13	12	12	11	11	10	11	11	12	14	13	13	12	12	12	10

$P_{ср} = \sum T_{гр} / T = 10$   
 $P_{max} = 14$   
 $K1 = P_{ср} / P_{max} = 0,74$

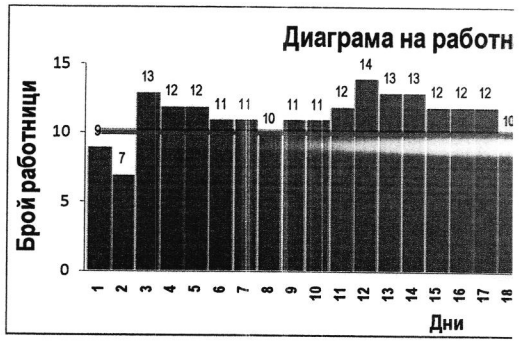

1.03.2019г.

Управи
