Линеен календарен график за изпълнение на Битова канализационна мрежа в кв."Бор"

Звено 3

№	Шифър	Наименование на работите	брой.ч.ч	мсм	брой.ч.д.	бр.работници за ден	необходими бр.дни	Механизация
1		Подписване на Протокол 2а и подготвителни работи за откриване на строителна площадка				10	2	
2		Изпълнение на "Временна организация на движението"				5	24	
Профил №1 битов L=548m							10	
Работа извършена от Звено 3, Поток 1, Бригада 3						103	7	
1	8101106231	Изкоп с ширина 1.21-4.00м в укрепени земни почви ръчно и дълбочина 0.00-2.00м	1868,69		234	34	7	
2	8101106232	Изкоп с ширина 1.21-4.00м в укрепени земни почви ръчно и дълбочина 2.01-4.00м	100,877		13	2	7	
3	8101106233	Изкоп с ширина 1.21-4.00м в укрепени земни почви ръчно и дълбочина 4.01-6.00м	466,459		59	9	7	
4	8101402220	Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт		51,9723	0	0	7	
5	8101119160	Превоз със самосвали на земни почви с натоварване с багер и обемно тегло 1.97т/м^3 на 6.0км		31,954	0	0	7	
6	8101119114	Превоз със самосвали на земни почви без натоварване и обемно тегло 1.97т/м^3 на 6.0км		16,891	0	0	7	
7	8101119026	Превоз на земни почви с камиони включително натоварване и разтоварване, обемно тегло 1.97т/м^3 на 6.0км		11,773	0	0	7	
8	8101409111	Разриване с булдозер на земни маси при нормални условия и побутване до 40м		1,67476	0	0	7	
9	8101201110	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи сширина до 6м. посредством разпонки при Н=0-2м. в земни почви	378,99		48	7	7	Багер Катерпилар 432Е; Товарен автомобил У 69 34 ВВ;
10	8101201210	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи сширина до 6м. посредством разпонки при Н=2-4м. в земни почви	36,92		5	1	7	
11	8101201310	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи сширина до 6м. посредством разпонки при Н=4-6м. в земни почви	550,103		69	10	7	
12		Снемане на разпонките при монтаж на стоманена конструкция 0-2м	63,165		8	2	7	
13		Снемане на разпонките при монтаж на стоманена конструкция 2-4м	42,6		6	1	7	
14		Направа на дървено трупче 20/20/28 и болт за хващане 20мм	44,936		6	1	7	
15		Монтаж на стоманена конструкция за укрепване на изкоп за положен канал	54,8	0,548	7	1	7	
16		Монтаж и демонтаж на дървени трупчета и болтове	49,32		7	1	7	
17		Демонтаж на стоманена конструкция за укрепване на изкоп за положен канал	27,4	0,548	4	1	7	
18		Преукрепване след демонтажа на стоманена констукция 0-2м	463,21		58	9	7	
19		Преукрепване след демонтажа на стоманена констукция 2-4м	355		45	7	7	
20		Доставка и монтаж на стоманобетонова разпонка 20/26 с L=0,70м	32,94	0,4941	5	1	7	
21	8243012000	Подложка от пясък	856,798		108	16	7	
Работа извършена от Звено 3, Поток 2, Бригада 3						45	7	

Месец 1

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	10	10																												
2		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5					
Профил №1 битов L=548m																														
Работа извършена от Звено 3, Поток 1, Бригада 3			103	103	103	103	103	103	103																					
1			34	34	34	34	34	34	34																					
2			2	2	2	2	2	2	2																					
3			9	9	9	9	9	9	9																					
4																														
5																														
6																														
7																														
8																														
9			7	7	7	7	7	7	7																					
10			1	1	1	1	1	1	1																					
11			10	10	10	10	10	10	10																					
12			2	2	2	2	2	2	2																					
13			1	1	1	1	1	1	1																					
14			1	1	1	1	1	1	1																					
15			1	1	1	1	1	1	1																					
16			1	1	1	1	1	1	1																					
17			1	1	1	1	1	1	1																					
18			9	9	9	9	9	9	9																					
19			7	7	7	7	7	7	7																					
20			1	1	1	1	1	1	1																					
21			16	16	16	16	16	16	16																					
Работа извършена от Звено 3, Поток 2, Бригада 3				45	45	45	45	45	45	45																				

ДЗЗД" ПЕМА-СТРОЙ"
гр. Пазарджик

22		PVC тръбни канали с диаметър на тръбата Ф315	1342,6		168	24	7	Генератор за ток - HONDA - EC3600; Помпа GRUNDFOS KP 250;
23	8244221080	Дренаж на канализация с каменинови или бетонови тръби Ф200	1096		137	20	7	
24	8243201100	Водочерпене с помпа до 500 л в мин и височина 20 до 32м	10,96	109,6	2	1	7	
Работа извършена от Звено 3, Поток 3, Бригада 3						56	8	ВИБРОПЛОЧА - КОМПАКТОР;
25	8101113100	Засипване на изкопи с ограничени ширини (тесни изкопи) без трамбоване със земна почва	1662,49		208	26	8	
26	8101114111	Уплътняване на земни почви ръчно с ръчна трамбовка на пластове от 10см	906,811		114	15	8	
27	8244283020	Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м от сглобяеми елементи с дълбочина до 2м	165	1,665	21	3	8	
28	8244283040	Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м от сглобяеми елементи с дълбочина до 4м	264	1,998	33	5	8	
29	8244283060	Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м от сглобяеми елементи с дълбочина до 6м	54	0,475	7	1	8	
30		Разбиване на стоманобетон с компресорен кортач	341,465	22,2915	43	6	8	
Работа извършена от Звено 3, Поток 4, Бригада 3						4	7	Машина за рязане на асфалт и бетон - Ъглошлайф STIHL TS 420; Двубандажен валяк - BOMAG BW 90 AD -2; Валяк - BW 65 - S; Реверсивна вибрационна плоча - BPR 45/55;
31	8243193000	Разваляне и възстановяване на трошенокаменна настилка	194,117	1,276	25	4	7	
Профил №2 битов L=256m							6	
Работа извършена от Звено 3, Поток 1, Бригада 3						99	3	Багер Катерпилар 432E; Товарен автомобил У 69 34 ВВ;
1	8101106231	Изкоп с ширина 1.21-4.00м в укрепени земни почви ръчно и дълбочина 0.00-2.00м	959,685		120	40	3	
2	8101106232	Изкоп с ширина 1.21-4.00м в укрепени земни почви ръчно и дълбочина 2.01-4.00м	37,1461		5	2	3	
3	8101402220	Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт		22,9137	0	0	3	
4	8101119160	Превоз със самосвали на земни почви с натоварване с багер и обемно тегло 1,97т/м^3 на 6.0км		14,165	0	0	3	
5	8101119114	Превоз със самосвали на земни почви без натоварване и обемно тегло 1.97т/м^3 на 6.0км		7,44694	0	0	3	
6	8101119026	Превоз на земни почви с камиони включително натоварване и разтоварване, обемно тегло 1.97т/м^3 на 6.0км		5,191	0	0	3	
7	8101409111	Разриване с булдозер на земни маси при нормални условия и побутване до 40м		0,72076	0	0	3	
8	8101201110	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи сширина до 6м. посредством разпонки при Н=0-2м. в земни почви	198,144		25	9	3	
9	8101201210	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи сширина до 6м. посредством разпонки при Н=2-4м. в земни почви	21,2992		3	1	3	
10		Снемане на разпонките при монтаж на стоманена конструкция 0-2м	33,024		5	2	3	
11		Снемане на разпонките при монтаж на стоманена конструкция 2-4м	24,576		4	2	3	
12		Направа на дървено трупче 20/20/28 и болт за хващане 20мм	20,992		3	1	3	
13		Монтаж на стоманена конструкция за укрепване на изкоп за положен канал	25,6	0,256	4	2	3	

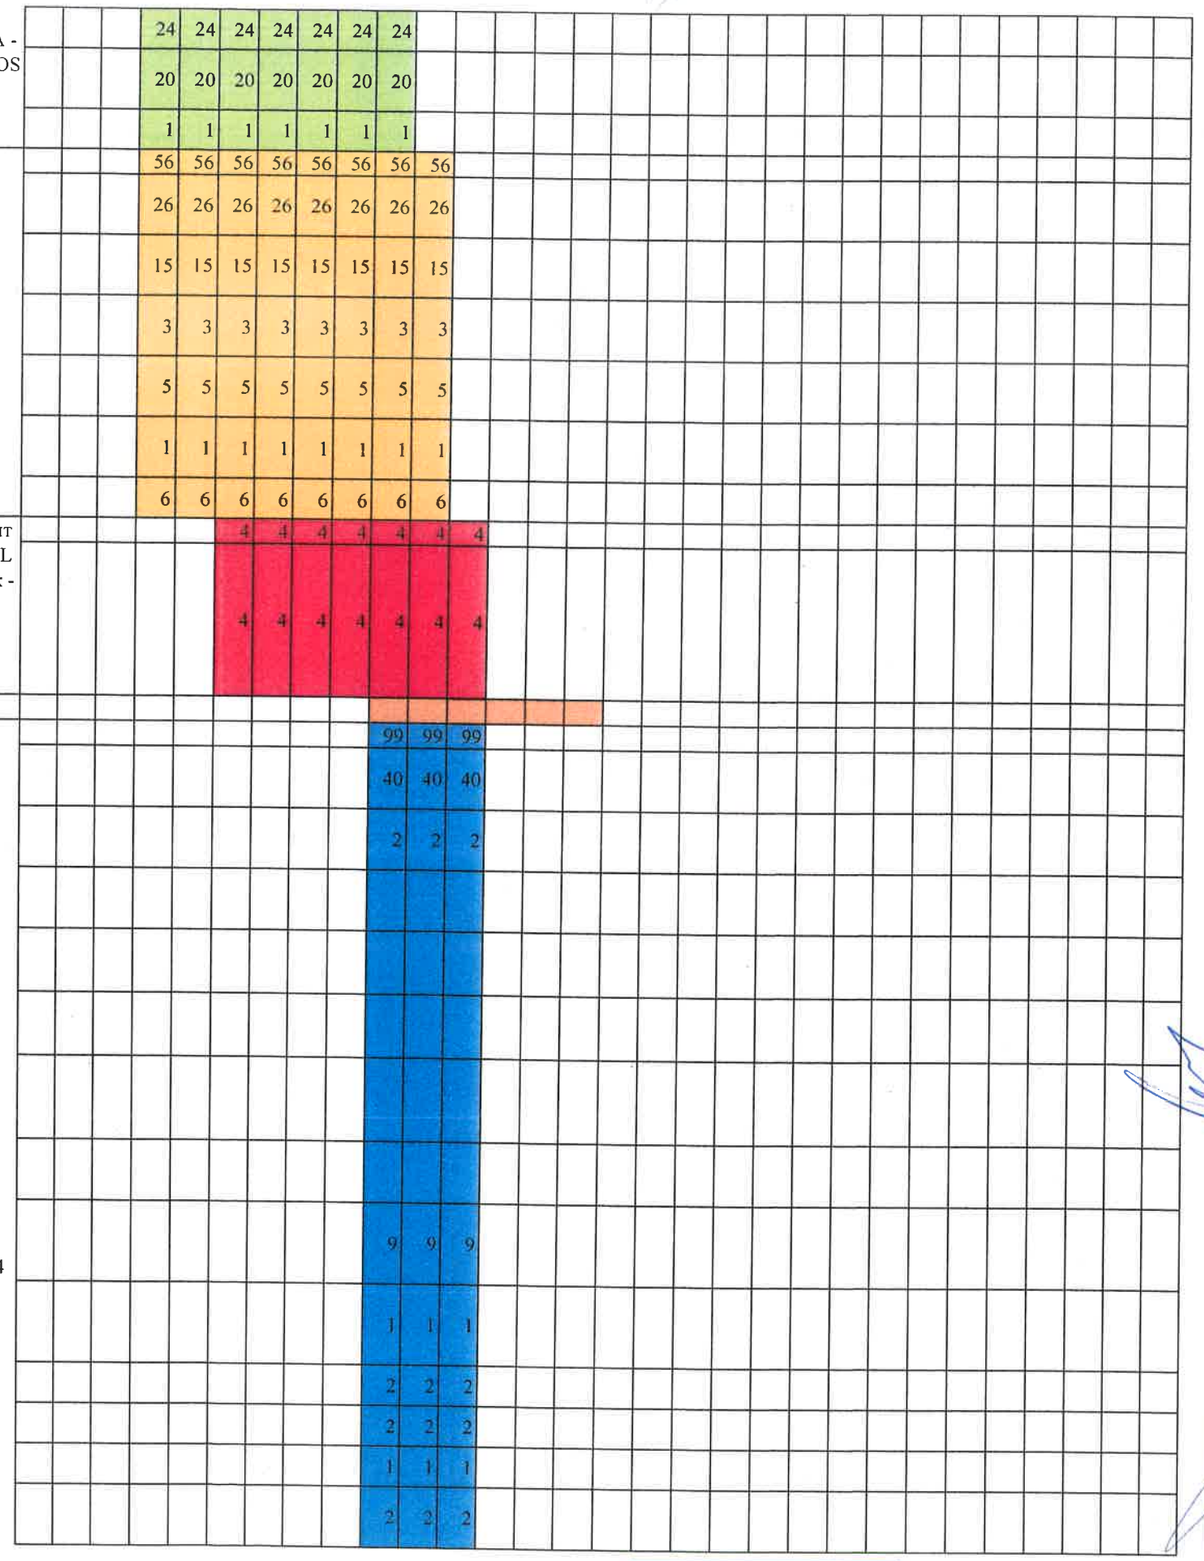

ДЗЗД "ПЕМА-СТРОЙ"
гр. Пазарджик

14		Монтаж и демонтаж на дървени трупчета и болтове	23,04		3	1	3	
15		Демонтаж на стоманена конструкция за укрепване на изкоп за положен канал	12,8	0,256	2	1	3	
16		Преукрепване след демонтажа на стоманена констукция 0-2м	242,176		31	11	3	
17		Преукрепване след демонтажа на стоманена констукция 2-4м	204,8		26	9	3	
18		Доставка и монтаж на стоманобетонова разпонка 20/26 с L=0,70м	15,42	0,2313	2	1	3	
19	8243012000	Подложка от пясък	400,256		51	17	3	
		Работа извършена от Звено 3, Поток 2, Бригада 3				50	3	Генератор за ток - HONDA - EC3600; Помпа GRUNDFOS KP 250;
20		PVC тръбни канали с диаметър на тръбата Ф315	627,2		79	27	3	
21	8244221080	Дренаж на канализация с каменинови или бетонови тръби Ф200	512		64	22	3	
22	8243201100	Водочерпене с помпа до 500 л в мин и височина 20 до 32м	5,12	51,2	1	1	3	
		Работа извършена от Звено 3, Поток 3, Бригада 3				61	3	ВИБРОПЛОЧА - КОМПАКТОР;
23	8101113100	Засипване на изкопи с ограничени ширини (тесни изкопи) без трамбоване със земна почва	736,95		93	31	3	
24	8101114111	Уплътняване на земни почви ръчно с ръчна трамбовка на пластове от 10см	401,973		51	17	3	
25	8244283040	Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м от сглобяеми елементи с дълбочина до 4м	220	1,665	28	10	3	
26	8244283060	Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м от сглобяеми елементи с дълбочина до 6м	54	0,475	7	3	3	
		Работа извършена от Звено 3, Поток 4, Бригада 3				35	3	Машина за рязане на асфалт и бетон - Ъглошлайф STIHL TS 420; Двубандажен валяк - BOMAG BW 90 AD -2; Валяк - BW 65 - S; Реверсивна вибрационна
27	8243191000	Разваляне и възстановяване на основен калдаръм	260,878	0,0492	33	11	3	
28	8243193000	Разваляне и възстановяване на трошенокаменна настилка	129,061	0,848	17	6	3	
29	8243195100	Асфалтова настилка с технологично гориво мазут	413,28	8,462	52	18	3	
		Профил №3 битов L=200m					6	
		Работа извършена от Звено 3, Поток 1, Бригада 3				83	3	
1	8101106231	Изкоп с ширина 1.21-4.00м в укрепени земни почви ръчно и дълбочина 0.00-2.00м	598,046		75	25	3	
2	8101106232	Изкоп с ширина 1.21-4.00м в укрепени земни почви ръчно и дълбочина 2.01-4.00м	262,284		33	11	3	
3	8101402220	Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт		19,1615	0	0	3	
4	8101119160	Превоз със самосвали на земни почви с натоварване с багер и обемно тегло 1.97т/м^3 на 6.0км		11,94	0	0	3	
5	8101119114	Превоз със самосвали на земни почви без натоварване и обемно тегло 1.97т/м^3 на 6.0км		6,22747	0	0	3	
6	8101119026	Превоз на земни почви с камиони включително натоварване и разтоварване, обемно тегло 1.97т/м^3 на 6.0км		4,341	0	0	3	
7	8101409111	Разриване с булдозер на земни маси при нормални условия и побутване до 40м		0,58086	0	0	3	
8	8101201110	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи сширина до 6м. посредством разпонки при Н=0-2м. в земни почви	154,8		20	7	3	Багер Катерпилар 432Е; Товарен автомобил У 69 34 ВВ;
9	8101201210	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи сширина до 6м. посредством разпонки при Н=2-4м. в земни почви	20,8		3	1	3	
10		Снемане на разпонките при монтаж на стоманена конструкция 0-2м	25,8		4	2	3	

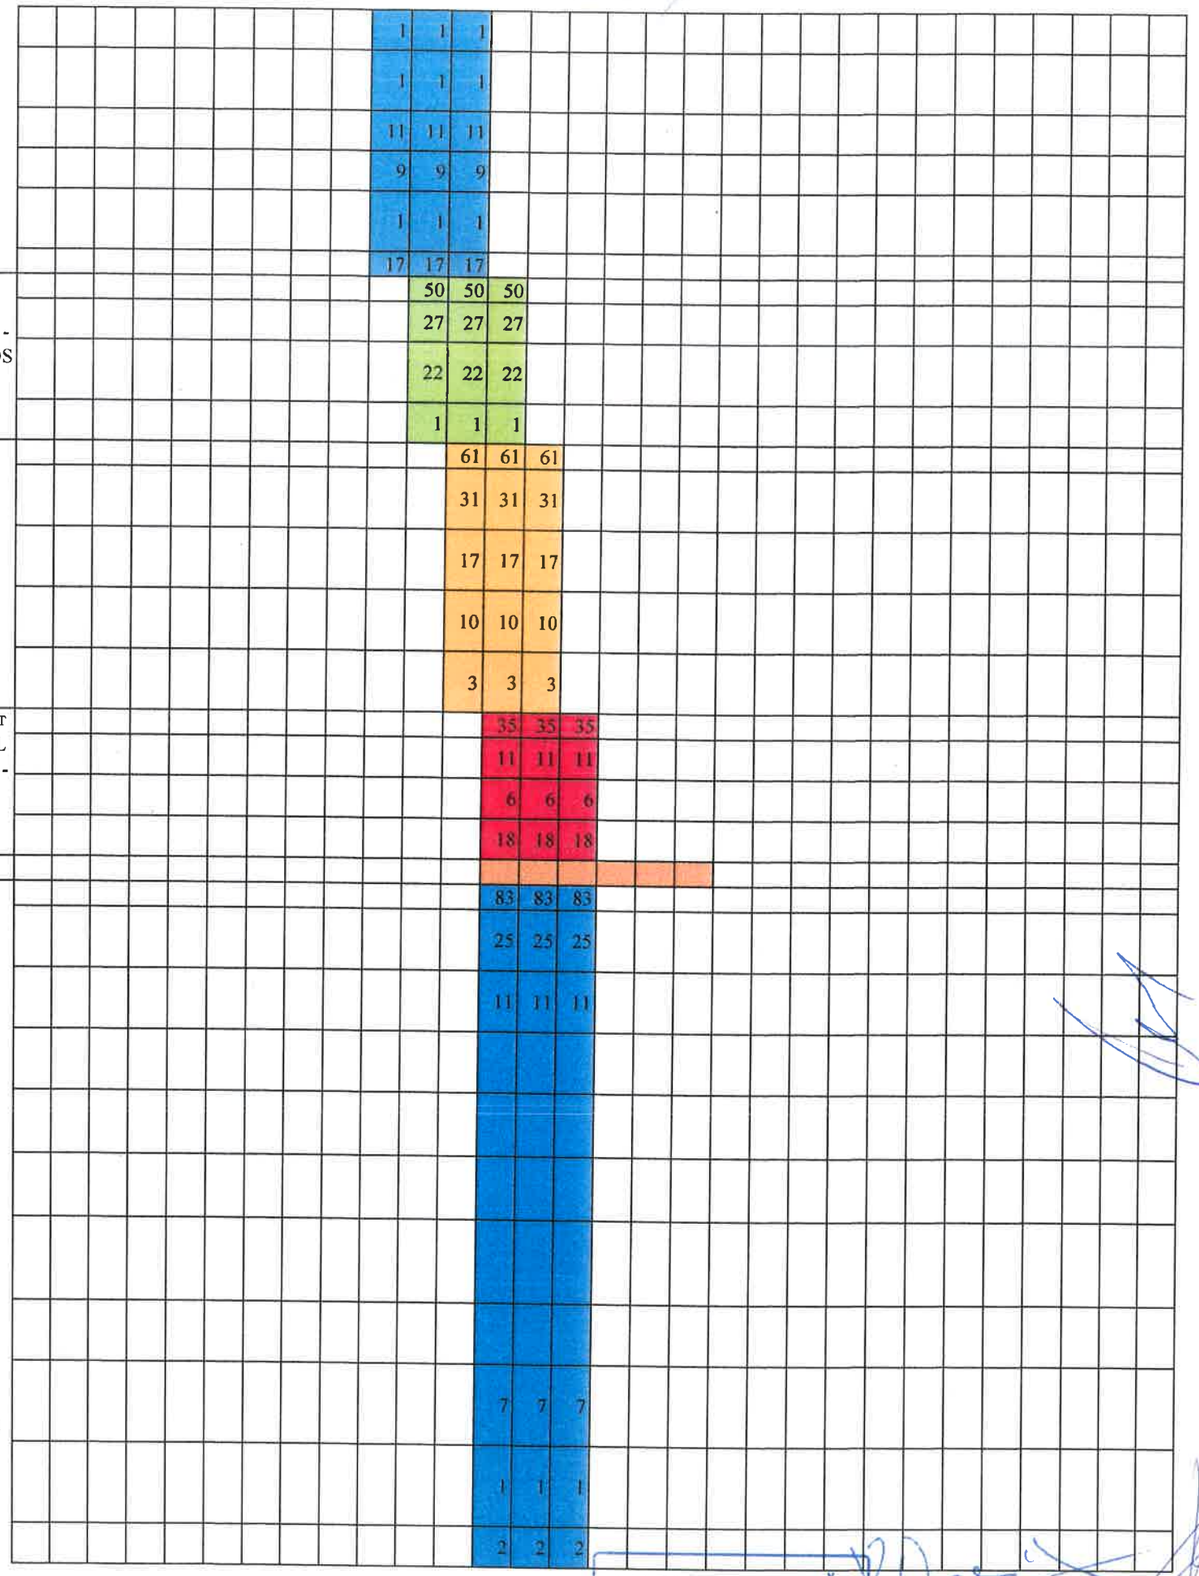

ДЗЗД" ПЕМА-СТРОЙ"
гр. Пазарджик

11		Снемане на разпонките при монтаж на стоманена конструкция 2-4м	24		3	1	3	
12		Направа на дървено трупче 20/20/28 и болт за хващане 20мм	16,4		3	1	3	
13		Монтаж на стоманена конструкция за укрепване на изкоп за положен канал	20	0,2	3	1	3	
14		Монтаж и демонтаж на дървени трупчета и болтове	18		3	1	3	
15		Демонтаж на стоманена конструкция за укрепване на изкоп за положен канал	10	0,2	2	1	3	
16		Преукрепване след демонтажа на стоманена констукция 0-2м	189,2		24	8	3	
17		Преукрепване след демонтажа на стоманена констукция 2-4м	200		25	9	3	
18		Доставка и монтаж на стоманобетонова разпонка 20/26 с L=0,70м	12,06	0,1809	2	1	3	
19	8243012000	Подложка от пясък	312,7		40	14	3	
		Работа извършена от Звено 3, Поток 2, Бригада 3				39	3	Генератор за ток - HONDA - EC3600; Помпа GRUNDFOS KP 250;
20		PVC тръбни канали с диаметър на тръбата Ф315	490		62	21	3	
21	8244221080	Дренаж на канализация с каменинови или бетонови тръби Ф200	400		50	17	3	
22	8243201100	Водочерпене с помпа до 500 л в мин и височина 20 до 32м	4	40	1	1	3	
		Работа извършена от Звено 3, Поток 3, Бригада 3				52	3	ВИБРОПЛОЧА - КОМПАКТОР;
23	8101113100	Засипване на изкопи с ограничени ширини (тесни изкопи) без трамбоване със земна почва	621,224		78	26	3	
24	8101114111	Уплътняване на земни почви ръчно с ръчна трамбовка на пластове от 10см	338,85		43	15	3	
25	8244283040	Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м от сглобяеми елементи с дълбочина до 4м	132	0,999	17	6	3	
26	8244283060	Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м от сглобяеми елементи с дълбочина до 6м	108	0,95	14	5	3	
		Работа извършена от Звено 3, Поток 4, Бригада 3				9	3	Машина за рязане на асфалт и бетон - Ъглошлайф STIHL TS 420; Двубандажен валяк -
27	8243193000	Разваляне и възстановяване на трошенокаменна настилка	209,856	1,379	27	9	3	
		Профил №4 битов L=199m					6	
		Работа извършена от Звено 3, Поток 1, Бригада 3				73	3	
1	8101106231	Изкоп с ширина 1.21-4.00м в укрепени земни почви ръчно и дълбочина 0.00-2.00м	627,368		79	27	3	
2	8101106232	Изкоп с ширина 1.21-4.00м в укрепени земни почви ръчно и дълбочина 2.01-4.00м	62,8619		8	3	3	
3	8101402220	Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт		15,7668	0	0	3	
4	8101119160	Превоз със самосвали на земни почви с натоварване с багер и обемно тегло 1.97т/м^3 на 6.0км		9,391	0	0	3	
5	8101119114	Превоз със самосвали на земни почви без натоварване и обемно тегло 1.97т/м^3 на 6.0км		5,12422	0	0	3	
6	8101119026	Превоз на земни почви с камиони включително натоварване и разтоварване, обемно тегло 1.97т/м^3 на 6.0км		3,572	0	0	3	
7	8101409111	Разриване с булдозер на земни маси при нормални условия и побутване до 40м		0,57763	0	0	3	
8	8101201110	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи сширина до 6м. посредством разпонки при Н=0-2м. в земни почви	154,026		20	7	3	Багер Катерпилар 432Е; Товарен автомобил У 69 34

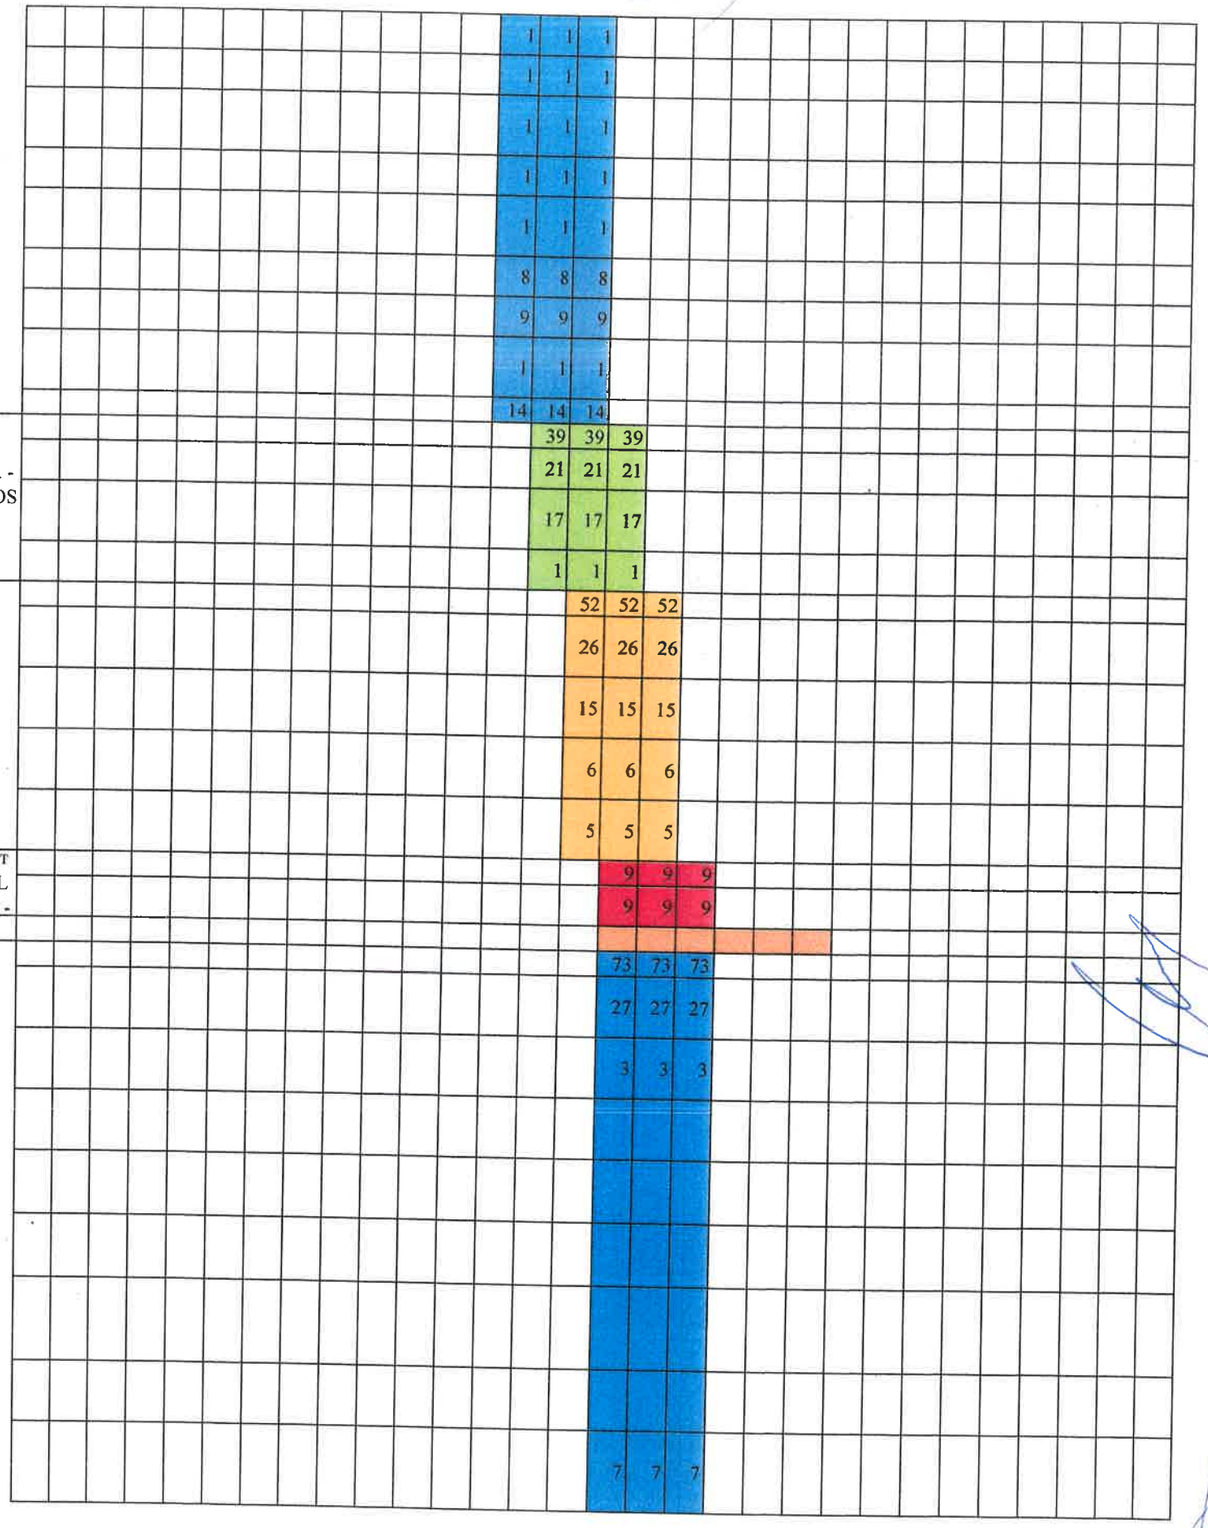

ДЗЗД "ПЕМА-СТРОЙ"
гр. Пазарджик

9	8101201210	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи сширина до 6м. посредством разпонки при Н=2-4м. в земни почви	13,4524		2	1	3	ВВ;
10		Снемане на разпонките при монтаж на стоманена конструкция 0-2м	25,671		4	2	3	
11		Снемане на разпонките при монтаж на стоманена конструкция 2-4м	15,522		2	1	3	
12		Направа на дървено трупче 20/20/28 и болт за хващане 20мм	16,318		3	1	3	
13		Монтаж на стоманена конструкция за укрепване на изкоп за положен канал	19,9	0,199	3	1	3	
14		Монтаж и демонтаж на дървени трупчета и болтове	17,91		3	1	3	
15		Демонтаж на стоманена конструкция за укрепване на изкоп за положен канал	9,95	0,199	2	1	3	
16		Преукрепване след демонтажа на стоманена констукция 0-2м	188,254		24	8	3	
17		Преукрепване след демонтажа на стоманена констукция 2-4м	129,35		17	6	3	
18		Доставка и монтаж на стоманобетонова разпонка 20/26 с L=0,70м	12	0,18	2	1	3	
19	8243012000	Подложка от пясък $м^3$	311,137		39	13	3	
		Работа извършена от Звено 3, Поток 2, Бригада 3				57	2	
20		PVC тръбни канали с диаметър на тръбата Ф315	487,55		61	31	2	Генератор за ток - HONDA - EC3600; Помпа GRUNDFOS KP 250;
21	8244221080	Дренаж на канализация с каменинови или бетонови тръби Ф200	398		50	25	2	
22	8243201100	Водочерпене с помпа до 500 л в мин и височина 20 до 32м	3,98	39,8	1	1	2	
		Работа извършена от Звено 3, Поток 3, Бригада 3				65	2	
23	8101113100	Засипване на изкопи с ограничени ширини (тесни изкопи) без трамбоване със земна почва	488,595		62	31	2	ВИБРОПЛОЧА - КОМПАКТОР;
24	8101114111	Уплътняване на земни почви ръчно с ръчна трамбовка на пластове от 10см	266,506		34	17	2	
25	8244283040	Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м от сглобяеми елементи с дълбочина до 4м	264	1,998	33	17	2	
		Работа извършена от Звено 3, Поток 4, Бригада 3				55	3	Машина за рязане на асфалт и бетон - Ъглошлайф STIHL TS 420; Двубандажен валяк - BOMAG BW 90 AD -2; Валяк - BW 65 - S; Реверсивна вибрационна плоча - BPR 45/55;
26	8243191000	Разваляне и възстановяване на основен калдаръм	422,071	0,0796	53	18	3	
27	8243193000	Разваляне и възстановяване на трошенокаменна настилка	208,807	1,372	27	9	3	
28	8243195100	Асфалтова настилка с технологично гориво мазут	668,64	13,691	84	28	3	
		Профил №5 битов L=65m					2	
		Работа извършена от Звено 3, Поток 1, Бригада 3				79	1	
1	8101106231	Изкоп с ширина 1.21-4.00м в укрепени земни почви ръчно и дълбочина 0.00-2.00м	260,862		33	33	1	
2	8101106232	Изкоп с ширина 1.21-4.00м в укрепени земни почви ръчно и дълбочина 2.01-4.00м	13,8884		2	2	1	
3	8101402220	Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт		6,30581	0	0	1	
4	8101119160	Превоз със самосвали на земни почви с натоварване с багер и обемно тегло 1.97т/$м^3$ на 6.0км		3,882	0	0	1	
5	8101119114	Превоз със самосвали на земни почви без натоварване и обемно тегло 1.97т/$м^3$ на 6.0км		2,04939	0	0	1	
6	8101119026	Превоз на земни почви с камиони включително натоварване и разтоварване, обемно тегло 1.97т/$м^3$ на 6.0км		1,428	0	0	1	

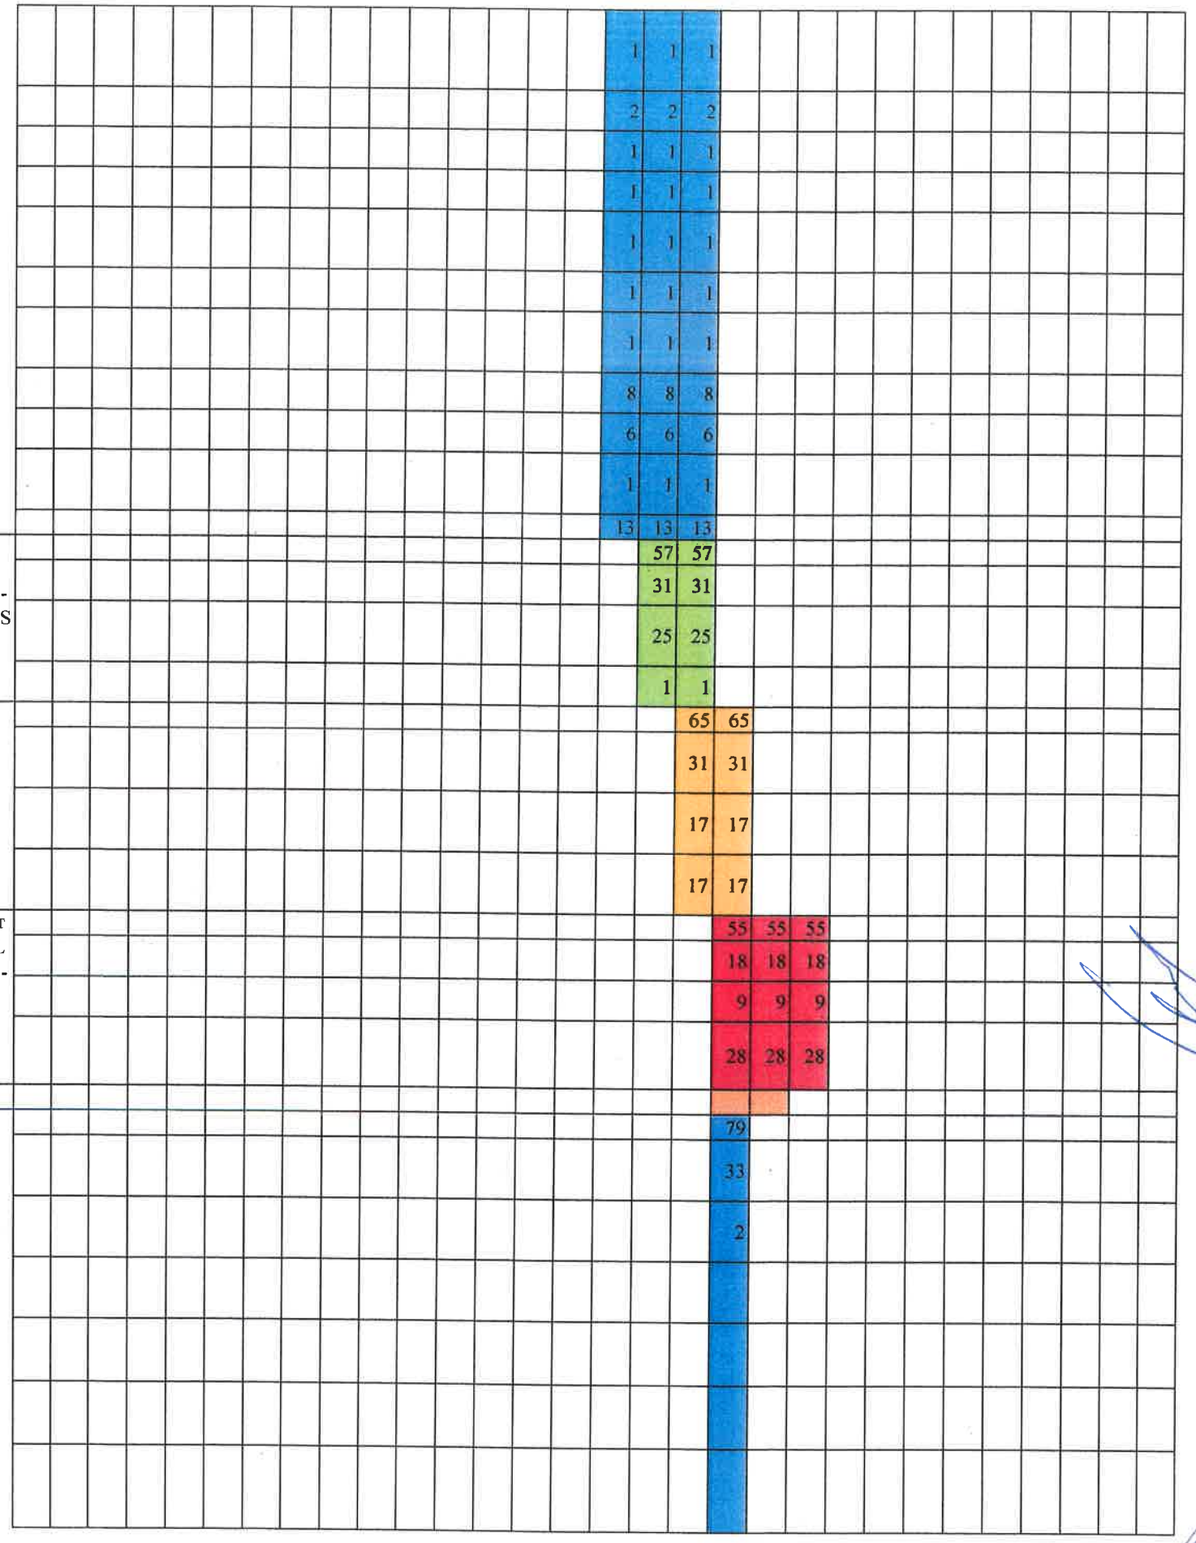

000147

ДЗЗД "ПЕМА-СТРОЙ"
гр. Пазарджик

7	8101409111	Разриване с булдозер на земни маси при нормални условия и побутване до 40м		0,20207	0	0	1	
8	8101201110	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи сширина до 6м. посредством разпонки при Н=0-2м. в земни почви	50,31		7	7	1	Багер Катерпилар 432Е; Товарен автомобил У 69 34 ВВ;
9	8101201210	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи сширина до 6м. посредством разпонки при Н=2-4м. в земни почви	5,239		1	1	1	
10		Снемане на разпонките при монтаж на стоманена конструкция 0-2м	8,385		2	2	1	
11		Снемане на разпонките при монтаж на стоманена конструкция 2-4м	6,045		1	1	1	
12		Направа на дървено трупче 20/20/28 и болт за хващане 20мм	5,33		1	1	1	
13		Монтаж на стоманена конструкция за укрепване на изкоп за положен канал	6,5	0,065	1	1	1	
14		Монтаж и демонтаж на дървени трупчета и болтове	5,85		1	1	1	
15		Демонтаж на стоманена конструкция за укрепване на изкоп за положен канал	3,25	0,065	1	1	1	
16		Преукрепване след демонтажа на стоманена констукция 0-2м	61,49		8	8	1	
17		Преукрепване след демонтажа на стоманена констукция 2-4м	50,375		7	7	1	
18		Доставка и монтаж на стоманобетонова разпонка 20/26 с L=0,70м	3,96	0,0594	1	1	1	
19	8243012000	Подложка от пясък $м^3$	101,628		13	13	1	
		Работа извършена от Звено 3, Поток 2, Бригада 3				38	1	
20		PVC тръбни канали с диаметър на тръбата Ф315	159,25		20	20	1	Генератор за ток - HONDA - EC3600; Помпа GRUNDFOS KP 250;
21	8244221080	Дренаж на канализация с каменинови или бетонови тръби Ф200	130		17	17	1	
22	8243201100	Водочерпене с помпа до 500 л в мин и височина 20 до 32м	1,3	13	1	1	1	
		Работа извършена от Звено 3, Поток 3, Бригада 3				57	1	
23	8101113100	Засипване на изкопи с ограничени ширини (тесни изкопи) без трамбоване със земна почва	201,965		26	26	1	ВИБРОПЛОЧА - КОМПАКТОР;
24	8101114111	Уплътняване на земни почви ръчно с ръчна трамбовка на пластове от 10см	110,163		14	14	1	
25	8244283040	Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м от сглобяеми елементи с дълбочина до 4м	132	0,999	17	17	1	
		Профил №6 битов L=298m					6	
		Работа извършена от Звено 3, Поток 1, Бригада 3				112	3	
1	8101106231	Изкоп с ширина 1.21-4.00м в укрепени земни почви ръчно и дълбочина 0.00-2.00м	1065,6		134	45	3	
2	8101106232	Изкоп с ширина 1.21-4.00м в укрепени земни почви ръчно и дълбочина 2.01-4.00м	139,262		18	6	3	
3	8101402220	Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт		27,4436	0	0	3	
4	8101119160	Превоз със самосвали на земни почви с натоварване с багер и обемно тегло 1.97т/$м^3$ на 6.0км		17,777	0	0	3	
5	8101119114	Превоз със самосвали на земни почви без натоварване и обемно тегло 1.97т/$м^3$ на 6.0км		8,91918	0	0	3	
6	8101119026	Превоз на земни почви с камиони включително натоварване и разтоварване, обемно тегло 1.97т/$м^3$ на 6.0км		6,217	0	0	3	
7	8101409111	Разриване с булдозер на земни маси при нормални условия и побутване до 40м		0,67677	0	0	3	

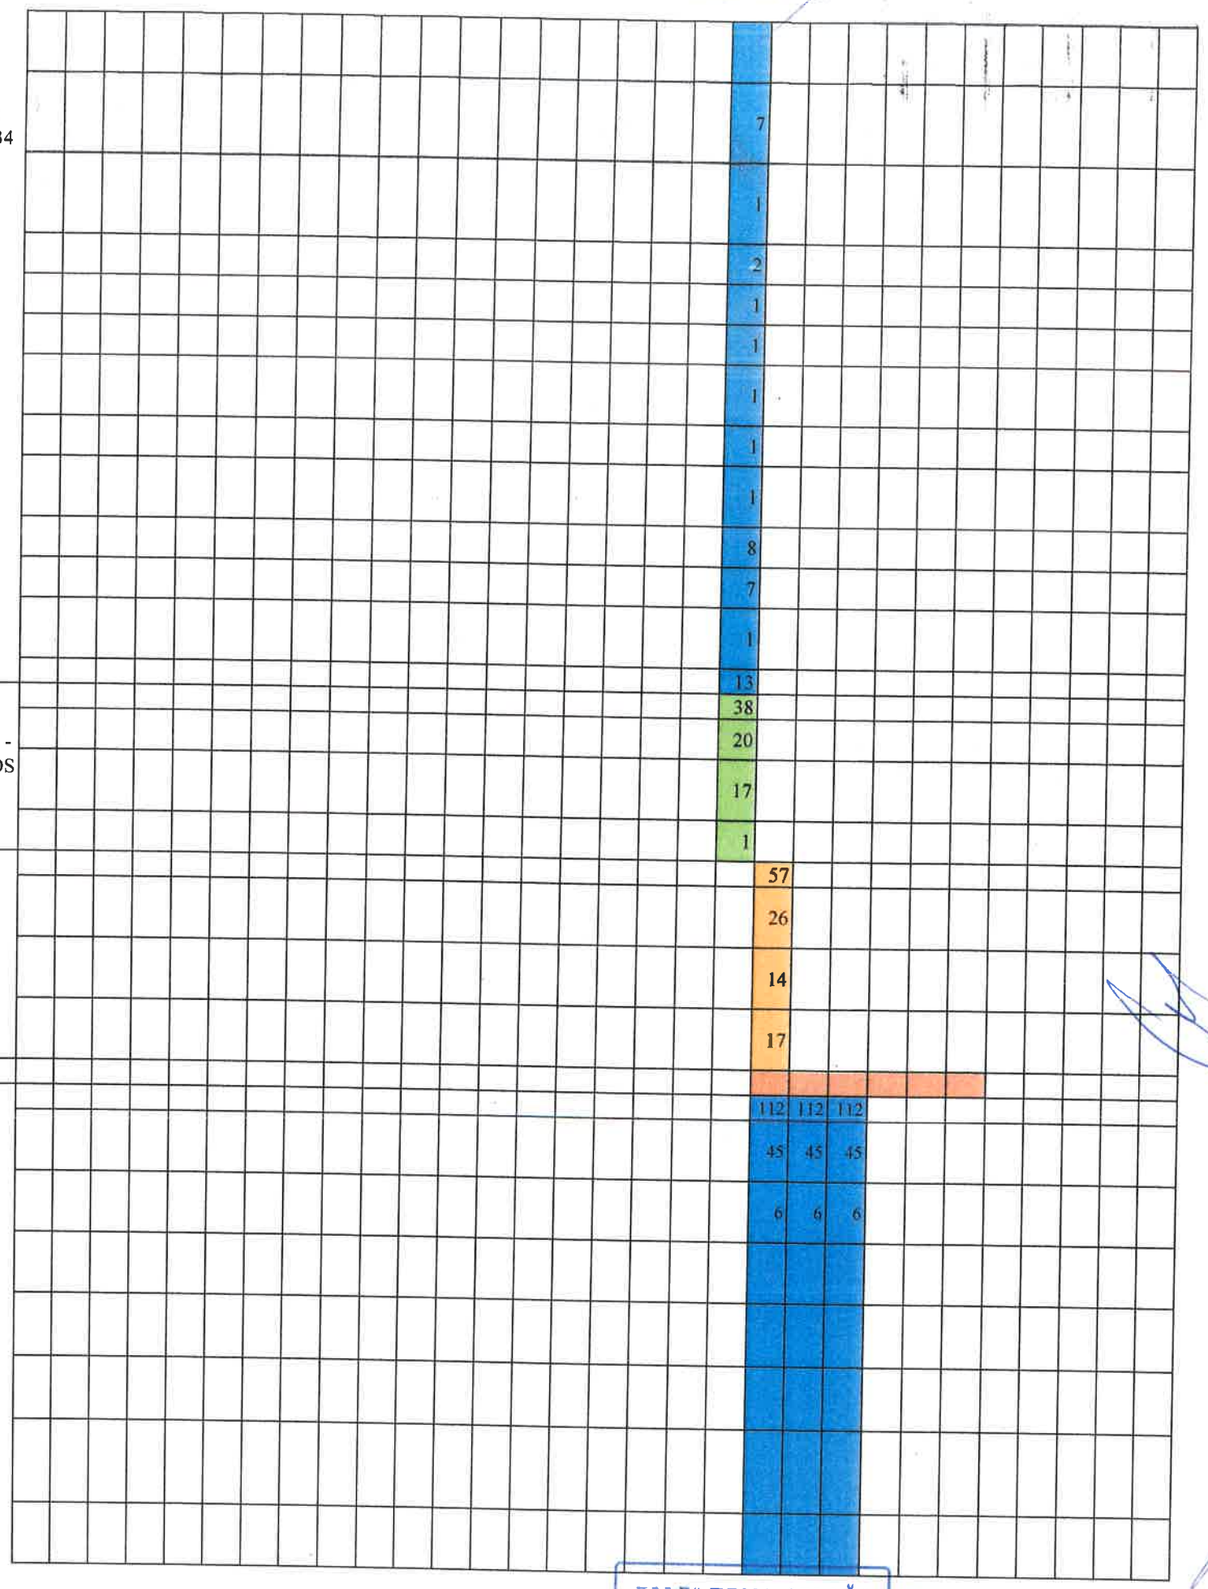

ДЗЗД" ПЕМА-СТРОЙ"
гр. Пазарджик

8	8101201110	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи сширина до 6м. посредством разпонки при Н=0-2м. в земни почви	230,652		29	10	3	Багер Катерпилар 432Е; Товарен автомобил У 69 34 ВВ;
9	8101201210	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи сширина до 6м. посредством разпонки при Н=2-4м. в земни почви	26,3432		4	2	3	
10		Снемане на разпонките при монтаж на стоманена конструкция 0-2м	38,442		5	2	3	
11		Снемане на разпонките при монтаж на стоманена конструкция 2-4м	30,396		4	2	3	
12		Направа на дървено трупче 20/20/28 и болт за хващане 20мм	24,436		4	2	3	
13		Монтаж на стоманена конструкция за укрепване на изкоп за положен канал	29,8	0,298	4	2	3	
14		Монтаж и демонтаж на дървени трупчета и болтове	26,82		4	2	3	
15		Демонтаж на стоманена конструкция за укрепване на изкоп за положен канал	14,9	0,298	2	1	3	
16		Преукрепване след демонтажа на стоманена констукция 0-2м	281,908		36	12	3	
17		Преукрепване след демонтажа на стоманена констукция 2-4м	253,3		32	11	3	
18		Доставка и монтаж на стоманобетонова разпонка 20/26 с L=0,70м	17,94	0,2691	3	1	3	
19	8243012000	Подложка от пясък	312,7		40	14	3	
		Работа извършена от Звено 3, Поток 2, Бригада 3				43	4	
20		PVC тръбни канали с диаметър на тръбата Ф315	730,1		92	23	4	Генератор за ток - HONDA - EC3600; Помпа GRUNDFOS KP 250;
21	8244221080	Дренаж на канализация с каменинови или бетонови тръби Ф200	596		75	19	4	
22	8243201100	Водочерпене с помпа до 500 л в мин и височина 20 до 32м	5,96	59,6	1	1	4	
		Работа извършена от Звено 3, Поток 3, Бригада 3				70	4	
23	8101113100	Засипване на изкопи с ограничени ширини (тесни изкопи) без трамбоване със земна почва	924,875		116	29	4	ВИБРОПЛОЧА - КОМПАКТОР;
24	8101114111	Уплътняване на земни почви ръчно с ръчна трамбовка на пластове от 10см	504,477		64	16	4	
25	8244283040	Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м от сглобяеми елементи с дълбочина до 4м	352	2,664	44	11	4	
26	8244283050	Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м от сглобяеми елементи с дълбочина до 5м	62	0,333	8	2	4	
27		Разбиване на стоманобетон с компресорен кртач	353,85	23,1	45	12	4	
		Работа извършена от Звено 3, Поток 4, Бригада 3				7	4	Машина за рязане на асфалт и бетон - Ъглошлайф STIHL TS 420; Двубандажен валяк -
28	8243193000	Разваляне и възстановяване на трошенокаменна настилка	209,856	1,379	27	7	4	
		Профил №7 битов L=152m					5	
		Работа извършена от Звено 3, Поток 1, Бригада 3				83	2	
1	8101106231	Изкоп с ширина 1.21-4.00м в укрепени земни почви ръчно и дълбочина 0.00-2.00м	462,031		58	29	2	
2	8101106232	Изкоп с ширина 1.21-4.00м в укрепени земни почви ръчно и дълбочина 2.01-4.00м	81,7667		11	6	2	
3	8101402220	Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт		12,3358	0	0	2	
4	8101119160	Превоз със самосвали на земни почви с натоварване с багер и обемно тегло 1.97т/м^3 на 6.0км		7,416	0	0	2	
5	8101119114	Превоз със самосвали на земни почви без натоварване и обемно тегло 1.97т/м^3 на 6.0км		4,00915	0	0	2	

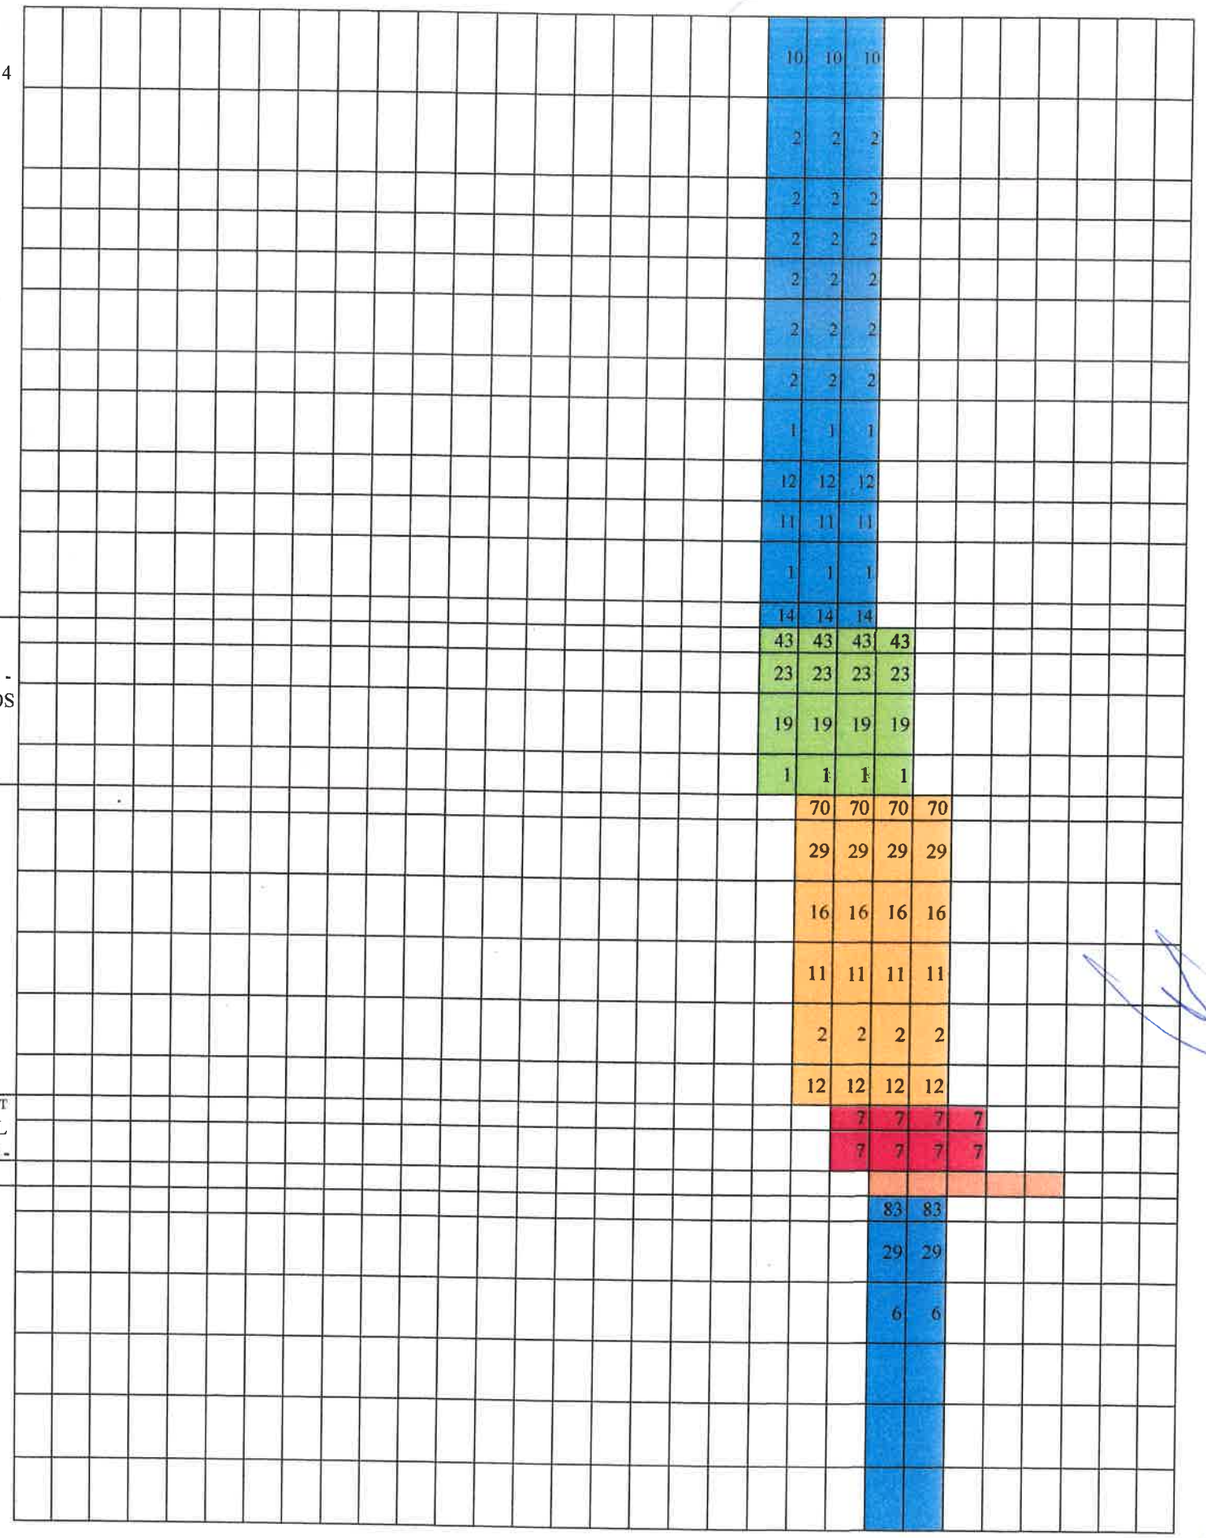

ДЗЗД "ПЕМА-СТРОЙ"
гр. Пазарджик

6	8101119026	Превоз на земни почви с камиони включително натоварване и разтоварване, обемно тегло 1,97т/м^3 на 6.0км		2,794	0	0	2
7	8101409111	Разриване с булдозер на земни маси при нормални условия и побутване до 40м		0,43633	0	0	2
8	8101201110	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи сширина до 6м. посредством разпонки при Н=0-2м. в земни почви	117,648		15	8	2
9	8101201210	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи сширина до 6м. посредством разпонки при Н=2-4м. в земни почви	11,0656		2	1	2
10		Снемане на разпонките при монтаж на стоманена конструкция 0-2м	19,608		3	2	2
11		Снемане на разпонките при монтаж на стоманена конструкция 2-4м	12,768		2	1	2
12		Направа на дървено трупче 20/20/28 и болт за хващане 20мм	12,464		2	1	2
13		Монтаж на стоманена конструкция за укрепване на изкоп за положен канал	15,2	0,152	2	1	2
14		Монтаж и демонтаж на дървени трупчета и болтове	13,68		2	1	2
15		Демонтаж на стоманена конструкция за укрепване на изкоп за положен канал	7,6	0,152	1	1	2
16		Преукрепване след демонтажа на стоманена констукция 0-2м	143,792		18	9	2
17		Преукрепване след демонтажа на стоманена констукция 2-4м	106,4		14	7	2
18		Доставка и монтаж на стоманобетонова разпонка 20/26 с L=0,70м	9,18	0,1377	2	1	2
19	8243012000	Подложка от пясък м^3	237,652		30	15	2
		Работа извършена от Звено 3, Поток 2, Бригада 3				44	2
20		PVC тръбни канали с диаметър на тръбата Ф315	372,4		47	24	2
21	8244221080	Дренаж на канализация с каменинови или бетонови тръби Ф200	304		38	19	2
22	8243201100	Водочерпене с помпа до 500 л в мин и височина 20 до 32м	3,04	30,4	1	1	2
		Работа извършена от Звено 3, Поток 3, Бригада 3				50	2
23	8101113100	Засипване на изкопи с ограничени ширини (тесни изкопи) без трамбоване със земна почва	385,808		49	25	2
24	8101114111	Уплътняване на земни почви ръчно с ръчна трамбовка на пластове от 10см	210,44		27	14	2
25	8244283040	Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м от сглобяеми елементи с дълбочина до 4м	176	1,332	22	11	2
		Работа извършена от Звено 3, Поток 4, Бригада 3				10	2

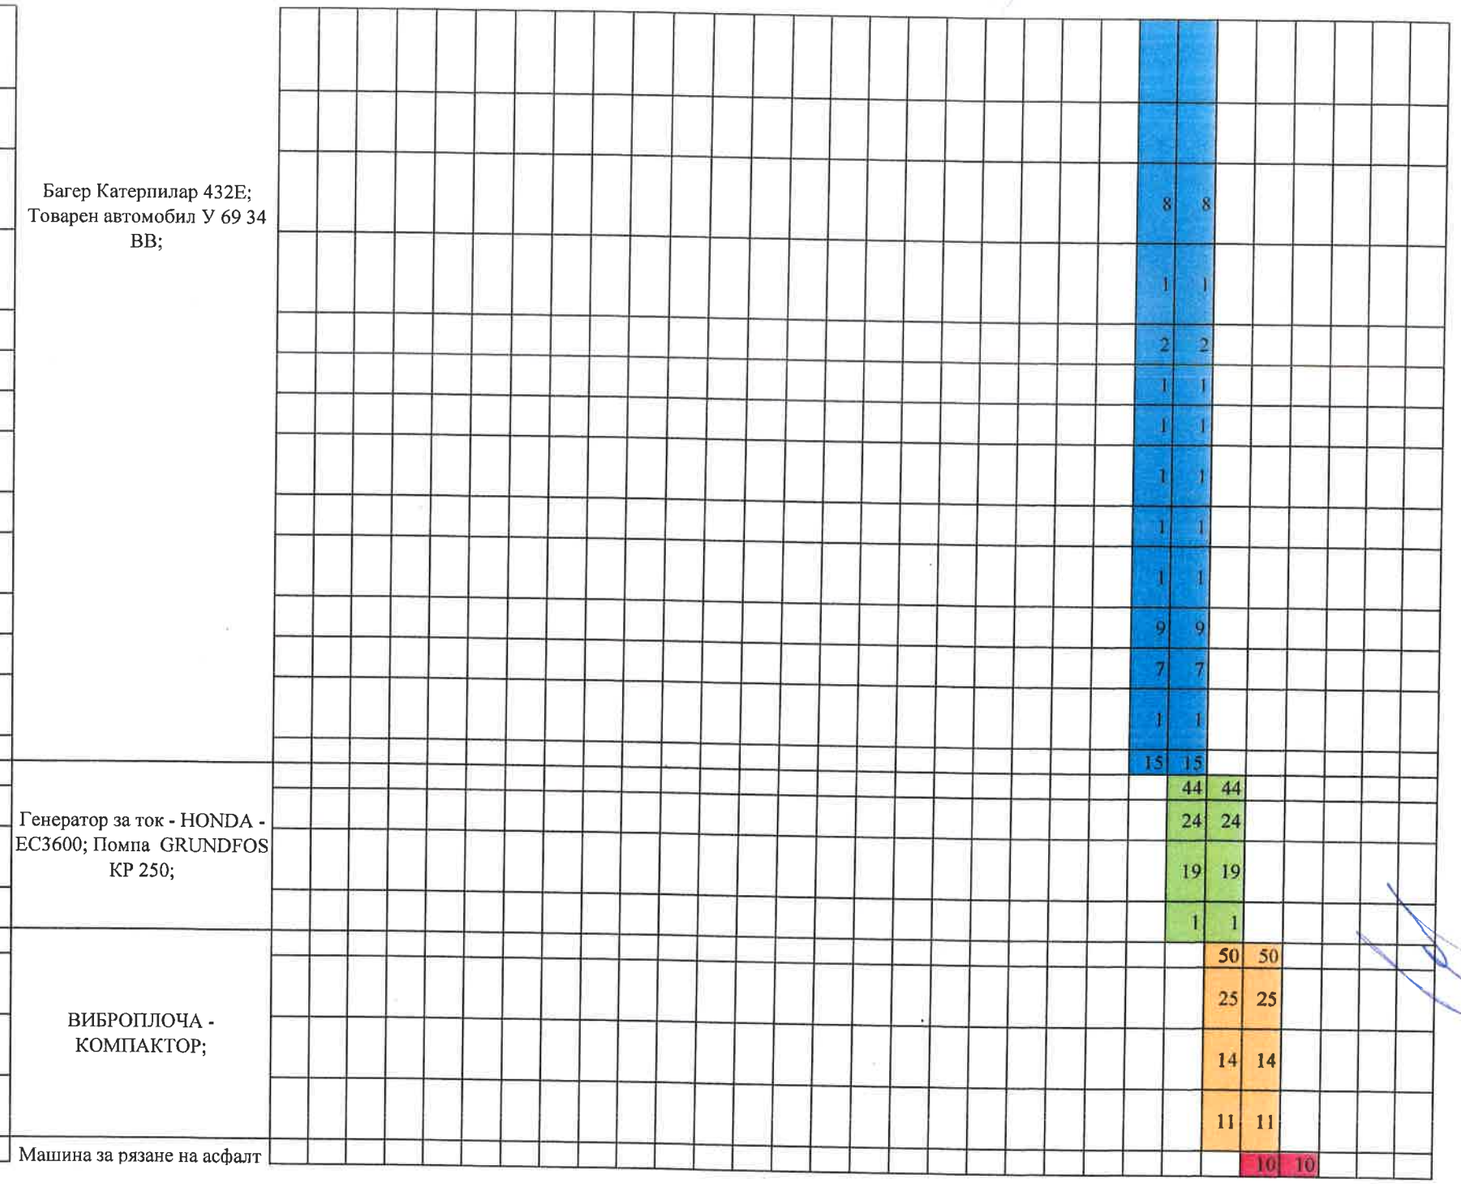

ДЗЗД "ПЕМА-СТРОЙ"
гр. Пазарджик

26	8243193000	Разваляне и възстановяванена трошенокаменна настилка	159,491	1,048	20	10	2	и бетон - Ъглошлайф STIHL TS 420; Двубандажен валяк - BOMAG BW 90 AD -2; Валяк - BW 65 - S; Реверсивна вибрационна плоча - BPR 45/55;																											10	10			
Сградни канализационни отклонения - 54бр.							25																																
Работа извършена от Звено 3, Поток 1, Бригада 3						15	22	Мини товарач - CAT CATERPILLAR 216B; Мини багер CAT CATERPILLAR 303C CR;			15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15					
1	8101106221	Изкоп с ширина 0.60 - 1.20м в укрепени земни почви ръчно и дълбочина 0.00-2.00м	136,713		18	1	22				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
2	8101106222	Изкоп с ширина 0.60 - 1.20м в укрепени земни почви ръчно и дълбочина 2.00-4.00м	912,28		115	6	22				6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6					
3	8101402220	Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт		21,7819	0	0	22																																
4	8101119160	Превоз със самосвали на земни почви с натоварване с багер и обемно тегло 1.97т/м^3 на 6.0км		12,923	0	0	22																																
5	8101119114	Превоз със самосвали на земни почви без натоварване и обемно тегло 1.97т/м^3 на 6.0км		7,07911	0	0	22																																
6	8101119026	Превоз на земни почви с камиони включително натоварване и разтоварване, обемно тегло 1.97т/м^3 на 6.0км		4,934	0	0	22																																
7	8101201110	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи сширина до 6м. посредством разпонки при Н=0-2м. в земни почви	292,572		37	2	22				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					
8	8101201210	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи сширина до 6м. посредством разпонки при Н=2-4м. в земни почви	326,592		41	2	22				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					
9	8243012000	Подложка от пясък	702,513		88	4	22				4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
Работа извършена от Звено 3, Поток 3, Бригада 3						13	22	ВИБРОПЛОЧА - КОМПАКТОР;					13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13				
10	8101113100	Засипване на изкопи с ограничени ширини (тесни изкопи) без трамбоване със земна почва	672,349		85	4	22						4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
11	8101114111	Уплътняване на земни почви ръчно с ръчна трамбовка на пластове от 10см	366,736		46	3	22						3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
12		PVC тръбни канали с диаметър на тръбата Ф200	756		95	5	22						5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5					
13		Доставка и монтаж на PE - тройник	118,8		15	1	22						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
Работа извършена от Звено 3, Поток 4, Бригада 3						8	22	Машина за рязане на асфалт и бетон - Ъглошлайф STIHL TS 420; Двубандажен валяк - BOMAG BW 90 AD -2; Валяк - BW 65 - S; Реверсивна вибрационна плоча - BPR 45/55;						8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8			
14	8243191000	Разваляне и възстановяване на основен калдаръм	300,646	0,0567	38	2	22							2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					
15	8243193000	Разваляне и възстановяване на трошенокаменна настилка	148,735	0,978	19	1	22							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
16	8243195100	Асфалтова настилка с технологично гориво мазут	476,28	9,752	60	3	22							3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
17	8102143300	Тротоар базалтови плочи	232,848		30	2	22							2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					
1		Въвеждане на обекта в експлоатация				7	3																												7	7	7		
Общо изпълнителски състав за ден									10	15	20	121	134	146	146	146	146	245	250	255	270	259	250	214	232	245	278	308	321	273	244	245	127	81	18	7	7	7		

* Забележка:

1 Ръководният персонал ще участва пряко и косвено при изпълнение на всеки отделен вид СМР.
2 При детайло запознаване с терена и подземните комуникации, и при възможност приоритетно ще бъдат използвани безизкопни технологии, които позволяват да бъде сведено до минимум въздействието върху околната среда.
3 В случай, че бъдем избрани за изпълнители на настоящата обществена поръчка, след сключване на договор ще бъде актуализиран линейния календарен график, като няма да бъде променено първоначално предложеното времетраене за осъществяване на обекта.
4 СКО и УО ще се изпълняват успоредно с линейните трасета
5 Продължителността на работния ден е 8 часа
6 Продължителността на една машиносмяна е 8 часа

ДЗЗД "ПЕМА-СТРОЙ"
гр. Пазарджик
