

ДО
ОБЩИНА ПЕРНИК

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на публична покана по реда на Глава осем „а” от ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител за изграждане на детски площадки, включени в поименния списък на капиталовите разходи на община Перник, по обособени позиции, както следва:

ЗА: Обособена позиция № 2 – Детски площадки в кв „Твърди ливади”, в Централна градска част и в кв. „Ралица”, гр. Перник са включени три подобекта: Подобект 3 – УПИ V, кв. 74 – ул. „Стара планина” и ул. „Околчица”, кв. „Ралица”; Подобект 4 – УПИ за озеленяване, кв. 9157 – пред IX-то ОУ, кв. „Твърди ливади”; Подобект 5 – УПИ за обществена градина и стопански дейности, кв. 251 – т.нар. „Банята”, ЦГЧ”

ОТ УЧАСТНИК: **„НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД**
(посочете наименованието на участника)

След запознаване с всички условия, изисквания и документи от документацията за участие в процедурата декларираме, че сме съгласни с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Предлагаме да изпълним настоящата обществена поръчка в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие и в техническата спецификация, неразделна част от настоящата документация за участие.

За изпълнението на поръчката предлагаме:

- Срок за изпълнение – 10 / десет/ календарни дни
- Гаранционен срок – 10 / десет/ години

Потвърждаваме, че настоящата оферта е съобразена с изискванията посочени в документацията за участие в процедурата и техническата спецификация и отговаря напълно на поставените изисквания. В доказателство на това сме приложили нужните документи.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с българското законодателство и с гореописаната оферта.

Срок на валидност на предложението:

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с техническото ни предложение до изтичане на **60 календарни дни**, считано от крайния срок за подаване на офертите.

Приложения:

1. Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП /ако е приложимо/.

2.....

(изброяват се конкретните приложени от участника документи)

| | |
|------------------|-----------------|
| Дата | 11.04.2016 год. |
| Име и фамилия | ВЕЛКО РУЙКОВ |
| Подпис (и печат) | |

ДО
ОБЩИНА ПЕРНИК

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на публична покана по реда на Глава осем „а” от ЗОП с предмет „Избор на изпълнител за изграждане на детски площадки, включени в поименния списък на капиталовите разходи на община Перник, по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 – „Детски площадки в кв.„Изток”, гр. Перник” са включени два подобекта:

Подобект 1 – УПИ I, кв. 39 – ул. „Рашо Димитров”, бл. 64, кв. „Изток”;

Подобект 2 – УПИ I за жилищно строителство – ул. „Благой Гебрев”, бл. 22, кв. „Изток”;

Обособена позиция № 2 – Детски площадки в кв „Твърди ливади”, в Централна градска част и в кв. „Ралица”, гр. Перник са включени три подобекта:

Подобект 3 – УПИ V, кв. 74 – ул. „Стара планина” и ул. „Околчица”, кв. „Ралица”;

Подобект 4 – УПИ за озеленяване, кв. 9157 – пред IX-то ОУ, кв. „Твърди ливади”;

Подобект 5 – УПИ за обществена градина и стопански дейности, кв. 251 – т.нар. „Банята”, ЦГЧ”

ОТ УЧАСТНИК: „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД

(посочете наименованието на участника)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас публична покана по реда на Глава осем „а” от ЗОП с предмет „Избор на изпълнител за изграждане на детски площадки, включени в поименния списък на капиталовите разходи на община Перник, по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 2 – Детски площадки в кв „Твърди ливади”, в Централна градска част и в кв. „Ралица”, гр. Перник са включени три подобекта:

Подобект 3 – УПИ V, кв. 74 – ул. „Стара планина” и ул. „Околчица”, кв. „Ралица”;

Подобект 4 – УПИ за озеленяване, кв. 9157 – пред IX-то ОУ, кв. „Твърди ливади”;

Подобект 5 – УПИ за обществена градина и стопански дейности, кв. 251 – т.нар. „Банята”, ЦГЧ”

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2:

Ще изпълним предмета на обществената поръчка за цена в общ размер на:

49 462.88 (четиридесет и девет хиляди четиристотин шестдесет и два лева и осемдесет и осем стотинки) лева без ДДС

59 355.46 (петдесет и девет хиляди триста петдесет и пет лева и четиридесет и шест стотинки) лева с ДДС

Съгласно единични цени по приложено КСС.

II. Компоненти на ценообразуването, за непосочени в единичните цени видове работи:

| | |
|---|--------------|
| 1. Часова ставка | 3.80лв/ч.час |
| 2. Допълнителни разходи върху труда | 90 % |
| 3. Допълнителни разходи върху механизацията | 25% |
| 4. Доставно-складови разходи | 8 % |
| 5. Печалба | 7 % |



Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на непредвидени от Възложителя видове строителни работи.

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.

ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ:

При така предложените от нас условия нашата ценова оферта включва всички дейности по изпълнение на договора.

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Приемаме предложението от Възложителя в проекта на Договор начин на плащане.

Обслужваща банка: ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА

Номер на сметката: IBAN BG 39FINV 9150 1016 4870 62

Б. код BIC FINVBGSF

Титуляр на сметката: Велко Венциславов Руйков

Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас обществена поръчка за избор на изпълнител. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Срок на валидност на предложението:

Настоящата оферта има валидност 60 календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

Приложение: Към настоящото Ценово предложение прилагаме:

1. Количествено-стойностна сметка на обособената позиция, за която участва;
2. Анализ на Единични цени.

ПОДПИС и ПЕЧАТ - ако е приложимо:

ВЕЛКО РУЙКОВ


(име и фамилия)

УПРАВИТЕЛ

(длъжност на представляващия Участника)

11.04.2016 год.

(дата)



Количествено-стойностна сметка

| ОБЩИНА ПЕРНИК, ОБЛАСТ ПЕРНИК | | | | | |
|---|---|----------|------------|---------------|-----------|
| ОБЕКТ: Детски площадки, включени в Поименния списък на капиталовите разходи за 2016г. | | | | | |
| № по ред | Описание на строително-монтажни работи | Ед.мярка | Количество | Единична цена | Обща цена |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Детски площадки в гр. Перник | | | | |
| | ПОДОБЕКТ 3: УПИ V, кв. 74 - КВ. МОГИЛИЧЕ ул. "Стара планина" | | | | |
| 1 | Демонтаж и извозване на съществуващи пейки | бр. | 2.00 | 11.40 | 22.80 |
| 2 | Демонтаж и извозване на съществуващи детски съоръжения | бр. | 4.00 | 7.13 | 28.52 |
| 3 | Доставка и полагане на градински бетонов бордюр - сив цвят; | м | 280.00 | 6.80 | 1904.00 |
| 4 | Доставка и полагане на пътен бордюр - сив цвят, р-р 15/30/50см | м | 150.00 | 11.21 | 1681.50 |
| 5 | Доставка и полагане на унипаваж - сив цвят, р-р 20/20/6см | м2 | 120.00 | 12.00 | 1440.00 |
| 6 | Доставка и полагане на бет.плочи - жълт цвят, тактилни за рампи р-р 30/30/6 см | м2 | 1.00 | 12.93 | 12.93 |
| 7 | Доставка и монтаж на дървени пейки с метална конструкция и облегалка (размери 180/50/82см); | бр. | 6.00 | 111.24 | 667.44 |
| 8 | Доставка и монтаж на кошчета за отпадъци р-р 45/80см; | бр. | 4.00 | 63.81 | 255.24 |
| 9 | Доставка и полагане на противоударна настилка в детска площадка, в т.ч. подложен бетон 10 см | м2 | 196.00 | 13.50 | 2646.00 |
| 10 | Детска пързалка | бр. | 1.00 | 597.81 | 597.81 |
| 11 | Комбинирана детска люлка с две места за люлеене тип махало | бр. | 1.00 | 601.45 | 601.45 |
| 12 | Детска клатушка | бр. | 2.00 | 356.30 | 712.60 |
| 13 | Изкоп за детски пясъчник на 40 см дълбочина | м3 | 2.00 | 9.33 | 18.66 |
| 14 | Доставка и полагане на бетон по контур на детски пясъчник вкл. кофраж и армировка | м3 | 2.50 | 64.96 | 162.40 |
| 15 | Полагане на геотекстил и чакъл с фракция, по-голяма от 8 mm, за дренаж под настилки от пясък с дебелина на слоя не по-малко от 10 см; | м2 | 4.00 | 2.12 | 8.48 |
| 16 | Доставка и разстилане на промит пясък с фракция от 0,2 до 2 mm (дебелина 30см); | м3 | 1.20 | 11.09 | 13.31 |
| 17 | Доставка и монтаж на дървена шапка по контур на детски пясъчник | м | 8.00 | 7.75 | 62.00 |
| 18 | Доставка и монтаж на дървена предпазна ограда с височина 1.00м ; с две врати широки 1.00м | м | 60.00 | 27.58 | 1654.80 |
| 19 | Доставка и монтаж на Информационна табела (мин.110/150 см.) | бр. | 1.00 | 64.47 | 64.47 |
| 20 | Почистване, изораване и фрезование на зелените площи; | м2 | 100.00 | 4.60 | 460.00 |



| | | | | | |
|----------------|---|-----|--------|--------|-----------------|
| 21 | Внасяне на обогатен почвен субстрат (10см); | м3 | 10.00 | 14.37 | 143.70 |
| 22 | Затревяване, валиране, поливане, торене, плевене и косене до втора коситба вкл. | м2 | 100.00 | 4.63 | 463.00 |
| 23 | Доставка и засаждане на широколистни дървета с височина 2.5 | бр. | 4.00 | 11.90 | 47.60 |
| 24 | Доставка и засаждане на храсти с височина 0.6 - 0.8 м | бр. | 50.00 | 7.47 | 373.50 |
| 25 | Направа на изкоп за подпорна стена | м3 | 10.00 | 5.49 | 54.90 |
| 26 | Доставка и полагане на бетон за фундамент и тяло на подпорна стена, вкл. кофраж и армировка | м3 | 15.00 | 91.63 | 1374.45 |
| 27 | Доставка и полагане на бетон за стъпала, вкл. кофраж и армировка | м3 | 6.00 | 100.05 | 600.30 |
| 28 | Изготвяне на строителни книжа | бр. | 1.00 | 577.80 | 577.80 |
| ВСИЧКО: | | | | | 16655.66 |

15.04.2016 г.

Велко Руйков:



00098

ПОДОБЕКТ 3: УПИ V, кв. 74 - КВ. МОГИЛИЧЕ ул. "Стара планина"

АНАЛИЗИ

ном име мяр. р.н. цена коеф. ст-ст.
 Анализ *000000003
 Демонтаж и извозване на съществуващи пейки
 за 1 бр.

1. МЕХАНИЗАЦИЯ р.н. цена коеф. ст-ст.
 САМОСВАЛ мсм 0.040 150.00 1.000 6.00 лв.
 6.00 лв.

ТРУД
 1. РАБОТНИК I ст. ч.ч. 0.225 3.80 1.000 0.86 лв.
 2. РАБОТНИК I ст. ч.ч. 0.211 3.80 1.000 0.80 лв.
 1.66 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли 8.00 % 0.00
 м-ция 25.00 % 1.50
 труд 90.00 % 1.49
 доп.р-ди (вс.) 2.99 лв.
 печалба 7.00 % 0.75 лв.
 ВСИЧКО: 11.40 лв.

Анализ *000000004
 Демонтаж и извозване на
 съществуващи детски съоръжения
 за 1 бр.

1. МЕХАНИЗАЦИЯ р.н. цена коеф. ст-ст.
 САМОСВАЛ мсм 0.004 150.00 1.000 0.60 лв.
 0.60 лв.

ТРУД
 1. РАБОТНИК I ст. ч.ч. 0.365 3.80 1.000 1.39 лв.
 2. РАБОТНИК I ст. ч.ч. 0.452 3.80 1.000 1.72 лв.
 3.11 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли 8.00 % 0.00
 м-ция 25.00 % 0.15
 труд 90.00 % 2.80
 доп.р-ди (вс.) 2.95 лв.
 печалба 7.00 % 0.47 лв.
 ВСИЧКО: 7.13 лв.

Анализ *000000005



Доставка и полагане на градински
бетонен бордюр - сив цвят;
за 1 м

| МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коэф. | ст-ст | |
|----------------|-------------------------|------|---------|--------|-------|----------|
| 1. | БОРДЮРИ БЕТОНОВИ - 8/10 | м | 1.000 | 2.5 | 1.000 | 2.50 лв. |
| 2. | БЕТОН М 100 - ОБИКНОВЕН | м3 | 0.003 | 100.00 | 1.000 | 0.25 лв. |
| | | | | | | 2.50 лв. |
| ТРУД | | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.236 | 3.80 | 1.000 | 0.90 лв. |
| 2. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.412 | 3.80 | 1.000 | 1.57 лв. |
| | | | | | | 2.47 лв. |
| ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| м-ли | | | 8.00 % | 0.42 | | |
| м-ция | | | 25.00 % | 0.00 | | |
| труд | | | 90.00 % | 2.22 | | |
| доп.р-ди (вс.) | | | | | | 2.64 лв. |
| печалба | | | 7.00 % | | | 0.73 лв. |
| ВСИЧКО: | | | | | | 6.80 лв. |

Анализ *000000006

Доставка и монтаж на дървени пейки с
метална конструкция и облегалка
(размери
за 1 бр.

| МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коэф. | ст-ст | |
|----------------|--|------|---------|-------|-------|------------|
| 1. | ДЪРВЕНИ ПЕЙКИ С МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ И ОБЛЕГАЛКА | бр. | 1.000 | 85.00 | 1.000 | 85.00 лв. |
| | | | | | | 85.00 лв. |
| ТРУД | | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.698 | 3.80 | 1.000 | 2.65 лв. |
| 2. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.987 | 3.80 | 1.000 | 3.75 лв. |
| | | | | | | 6.40 лв. |
| ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| м-ли | | | 8.00 % | 6.80 | | |
| м-ция | | | 25.00 % | 0.00 | | |
| труд | | | 90.00 % | 5.76 | | |
| доп.р-ди (вс.) | | | | | | 12.56 лв. |
| печалба | | | 7.00 % | | | 7.28 лв. |
| ВСИЧКО: | | | | | | 111.24 лв. |

Анализ *000000007

Доставка и монтаж на кошчета за
отпадъци р-р 45/80см;



00100

за 1 бр.

| | МАТЕРИАЛИ | р.н. | цена | коэф. | ст-ст | |
|----|--------------------------------------|---------|-------|-------|-------|----------|
| 1. | КОШЧЕТА ЗА ОТПАДЪЦИ Р-Р 45/80СМ; бр. | 1.000 | 45.00 | 1.000 | 45.00 | лв. |
| | | | | | 45.00 | лв. |
| | ТРУД | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.654 | 3.80 | 1.000 | 2.49 лв. |
| 2. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.875 | 3.80 | 1.000 | 3.32 лв. |
| | | | | | 5.81 | лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | м-ли | 8.00 % | 3.60 | | | |
| | м-ция | 25.00 % | 0.00 | | | |
| | труд | 90.00 % | 5.23 | | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | 8.83 | лв. |
| | печалба | 7.00 % | | | 4.17 | лв. |
| | ВСИЧКО: | | | | 63.81 | лв. |

Анализ *000000008


Доставка и полагане на унипаваж - сив цвят, р-р 20/20/6см- в детска площадка за 1 бр.

| | МАТЕРИАЛИ | р.н. | цена | коэф. | ст-ст | |
|----|---------------------------------------|---------|------|-------|-------|-----|
| 1. | УНИПАВАЖ - СИВ ЦВЯТ, Р-Р 20/20/6СМ м2 | 1.000 | 0.00 | 1.000 | 0.00 | лв. |
| | | | | | 0.00 | лв. |
| | ТРУД | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 3.80 | 1.000 | 0.00 | лв. |
| 2. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 3.80 | 1.000 | 0.00 | лв. |
| | | | | | 0.00 | лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | м-ли | 8.00 % | 0.00 | | | |
| | м-ция | 25.00 % | 0.00 | | | |
| | труд | 90.00 % | 0.00 | | | |
| | ВСИЧКО: | | | | 0.00 | лв. |

Анализ *000000009

Доставка и полагане на противоударна настилка в детска площадка, в т.ч. подложе за 1 м2

| | МАТЕРИАЛИ | р.н. | цена | коэф. | ст-ст | |
|----|------------------------|------|-------|-------|-------|----------|
| 1. | ПРОТИВОУДАРНА НАСТИЛКА | м2 | 1.000 | 5.7 | 1.000 | 6.00 лв. |

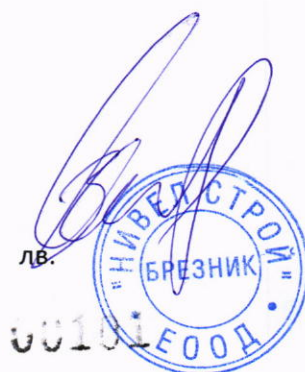

5.70 лв.

| | | | | | | |
|------|----------------|------|-------|------|-------|----------|
| ТРУД | | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.365 | 3.80 | 1.000 | 1.39 лв. |
| 2. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.652 | 3.80 | 1.000 | 2.48 лв. |
| | | | | | | 3.87 лв. |

ДОП.РАЗХОДИ:

| | | | | | | |
|----------------|---------|------|--|--|--|-----------|
| м-ли | 8.00 % | 0.48 | | | | |
| м-ция | 25.00 % | 0.00 | | | | |
| труд | 90.00 % | 3.48 | | | | |
| доп.р-ди (вс.) | | | | | | 3.96 лв. |
| печалба | 7.00 % | | | | | 0.97 лв. |
| ВСИЧКО: | | | | | | 13.50 лв. |

Анализ *000000010

Детска пързалка
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ

| | | р.н. | цена | коэф. | ст-ст | |
|----|-----------------|------|-------|--------|-------|------------|
| 1. | ДЕТСКА ПЪРЗАЛКА | бр. | 1.000 | 500.00 | 1.000 | 500.00 лв. |
| | | | | | | 500.00 лв. |

ТРУД

| | | | | | | |
|----|----------------|------|-------|------|-------|----------|
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 1.230 | 3.80 | 1.000 | 4.67 лв. |
| 2. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 1.360 | 3.80 | 1.000 | 5.17 лв. |
| | | | | | | 9.84 лв. |

ДОП.РАЗХОДИ:

| | | | | | | |
|----------------|---------|-------|--|--|--|-----------|
| м-ли | 8.00 % | 40.00 | | | | |
| м-ция | 25.00 % | 0.00 | | | | |
| труд | 90.00 % | 8.86 | | | | |
| доп.р-ди (вс.) | | | | | | 48.86 лв. |
| печалба | 7.00 % | | | | | 39.11 лв. |

ВСИЧКО:

597.81 лв.

Анализ *000000011

Комбинирана детска люлка с две места
за люлеене тип махало
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ

| | | р.н. | цена | коэф. | ст-ст | |
|----|--|------|-------|--------|-------|------------|
| 1. | КОМБИНИРАНА ДЕТСКА ЛЮЛКА С ДВЕ МЕСТА ЗА ЛЮЛЕЕНЕ ТИП | бр. | 1.000 | 500.00 | 1.000 | 500.00 лв. |
| | | | | | | 500.00 лв. |

ТРУД



001002

| | | | | | | | |
|--------------|----------------|------|---------|-------|-------|--------|-----|
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 1.570 | 3.80 | 1.000 | 5.97 | лв. |
| 2. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 1.489 | 3.80 | 1.000 | 5.66 | лв. |
| | | | | | | 11.63 | лв. |
| ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | | |
| | м-ли | | 8.00 % | 40.00 | | | |
| | м-ция | | 25.00 % | 0.00 | | | |
| | труд | | 90.00 % | 10.47 | | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 50.47 | лв. |
| | печалба | | 7.00 % | | | 39.35 | лв. |
| ВСИЧКО: | | | | | | 601.45 | лв. |

Анализ *000000012
Детска клатушка
за 1 бр.

| МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коэф. | ст-ст | | |
|--------------|-----------------|------|---------|--------|-------|--------|-----|
| 1. | ДЕТСКА КЛАТУШКА | бр. | 1.000 | 300.00 | 1.000 | 300.00 | лв. |
| | | | | | | 300.00 | лв. |
| ТРУД | | | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.687 | 3.80 | 1.000 | 2.61 | лв. |
| 2. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.558 | 3.80 | 1.000 | 2.12 | лв. |
| | | | | | | 4.73 | лв. |
| ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | | |
| | м-ли | | 8.00 % | 24.00 | | | |
| | м-ция | | 25.00 % | 0.00 | | | |
| | труд | | 90.00 % | 4.26 | | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 28.26 | лв. |
| | печалба | | 7.00 % | | | 23.31 | лв. |
| ВСИЧКО: | | | | | | 356.30 | лв. |

Анализ *000000013
Изкоп за детски пясъчник на 40 см
дълбочина
за 1 м3

| ТРУД | | р.н. | цена | коэф. | ст-ст | | |
|--------------|----------------|------|---------|-------|-------|------|-----|
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.652 | 3.80 | 1.000 | 2.48 | лв. |
| 2. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.554 | 3.80 | 1.000 | 2.11 | лв. |
| | | | | | | 4.59 | лв. |
| ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | | |
| | м-ли | | 8.00 % | 0.00 | | | |
| | м-ция | | 25.00 % | 0.00 | | | |



| | | | | | | |
|----------------|---------|------|--|--|------|-----|
| труд | 90.00 % | 4.13 | | | | |
| доп.р-ди (вс.) | | | | | 4.13 | лв. |
| печалба | 7.00 % | | | | 0.61 | лв. |
| ВСИЧКО: | | | | | 9.33 | лв. |

Анализ *000000014

Доставка и полагане на бетон по контур
на детски пясъчник вкл. кофраж и
армиров
за 1 м3

| МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коеф. | ст-ст | |
|-----------|--|------|--------|--------|-------|------------------------|
| 1. | БЕТОН В15 | м3 | 0.250 | 105.00 | 1.000 | 26.25 лв. |
| 2. | АРМИРОВКА СТОМАНА Аt C ДИАМЕТЪР ДО 12ММ | кг | 20.000 | 1.20 | 1.000 | 24.00 лв. 50.25 лв. |
| ТРУД | | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.654 | 3.80 | 1.000 | 2.49 лв. |
| 2. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.236 | 3.80 | 1.000 | 0.90 лв. 3.39 лв. |

ДОП.РАЗХОДИ:

| | | | | | | |
|----------------|---------|------|--|--|-------|-----|
| м-ли | 8.00 % | 4.02 | | | | |
| м-ция | 25.00 % | 0.00 | | | | |
| труд | 90.00 % | 3.05 | | | | |
| доп.р-ди (вс.) | | | | | 7.07 | лв. |
| печалба | 7.00 % | | | | 4.25 | лв. |
| ВСИЧКО: | | | | | 64.96 | лв. |

Анализ *000000015

Полагане на геотекстил и чакъл с
фракция, по-голяма от 8 mm, за дренаж
под наст
за 1 м2

| МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коеф. | ст-ст | |
|-----------|----------------|------|-------|-------|-------|----------------------|
| 1. | ГЕОТЕКСТИЛ | м2 | 1.000 | 1.40 | 1.000 | 1.40 лв. 1.40 лв. |
| ТРУД | | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.052 | 3.80 | 1.000 | 0.20 лв. |
| 2. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.012 | 3.80 | 1.000 | 0.05 лв. 0.25 лв. |

ДОП.РАЗХОДИ:

| | | | | | | |
|----------------|---------|------|--|--|------|-----|
| м-ли | 8.00 % | 0.11 | | | | |
| м-ция | 25.00 % | 0.00 | | | | |
| труд | 90.00 % | 0.22 | | | | |
| доп.р-ди (вс.) | | | | | 0.33 | лв. |



| | | | |
|---------|--------|------|-----|
| печалба | 7.00 % | 0.14 | лв. |
| ВСИЧКО: | | 2.12 | лв. |

Анализ *000000016

Доставка и разстилане на промит пясък с фракция от 0,2 до 2 mm (дебелина 30см);
за 1 м3

| | МАТЕРИАЛИ | р.н. | цена | коэф. | ст-ст | | |
|----|---------------------------------------|------|---------|-------|-------|-------|-----|
| 1. | ПРОМИТ ПЯСЪК С ФРАКЦИЯ ОТ 0,2 ДО 2 ММ | м3 | 1.000 | 6.00 | 1.000 | 6.00 | лв. |
| | | | | | | 6.00 | лв. |
| | ТРУД | | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.325 | 3.80 | 1.000 | 1.23 | лв. |
| 2. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.214 | 3.80 | 1.000 | 0.81 | лв. |
| | | | | | | 2.04 | лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | м-ли | | 8.00 % | 0.48 | | | |
| | м-ция | | 25.00 % | 0.00 | | | |
| | труд | | 90.00 % | 1.84 | | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 2.32 | лв. |
| | печалба | | 7.00 % | | | 0.73 | лв. |
| | ВСИЧКО: | | | | | 11.09 | лв. |

Анализ *000000017

Доставка и монтаж на дървена шапка по контур на детски пясъчник
за 1 м

| | МАТЕРИАЛИ | р.н. | цена | коэф. | ст-ст | | |
|----|----------------|------|---------|-------|-------|------|-----|
| 1. | ДЪРВЕНА ШАПКА | м | 1.000 | 4.20 | 1.000 | 4.20 | лв. |
| | | | | | | 4.20 | лв. |
| | ТРУД | | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.230 | 3.80 | 1.000 | 0.87 | лв. |
| 2. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.145 | 3.80 | 1.000 | 0.55 | лв. |
| | | | | | | 1.42 | лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | м-ли | | 8.00 % | 0.34 | | | |
| | м-ция | | 25.00 % | 0.00 | | | |
| | труд | | 90.00 % | 1.28 | | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 1.62 | лв. |
| | печалба | | 7.00 % | | | 0.51 | лв. |
| | ВСИЧКО: | | | | | 7.75 | лв. |



Анализ *000000018

Доставка и монтаж на дървена
предпазна ограда с височина 1.00м ; с
две врати ши
за 1 м

| | МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коэф. | ст-ст | |
|----|--------------------------|------|---------|-------|-------|-------|-----|
| 1. | ДЪРВЕНА ПРЕДПАЗНА ОГРАДА | м | 1.000 | 20.00 | 1.000 | 20.00 | лв. |
| | | | | | | 20.00 | лв. |
| | ТРУД | | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.365 | 3.80 | 1.000 | 1.39 | лв. |
| 2. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.214 | 3.80 | 1.000 | 0.81 | лв. |
| | | | | | | 2.20 | лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | м-ли | | 8.00 % | 1.60 | | | |
| | м-ция | | 25.00 % | 0.00 | | | |
| | труд | | 90.00 % | 1.98 | | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 3.58 | лв. |
| | печалба | | 7.00 % | | | 1.80 | лв. |
| | ВСИЧКО: | | | | | 27.58 | лв. |

Анализ *000000019

Доставка и монтаж на Информационна
табела (мин.110/150 см.)
за 1 бр.

| | МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коэф. | ст-ст | |
|----|----------------------|------|---------|-------|-------|-------|-----|
| 1. | ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА | бр. | 1.000 | 50.00 | 1.000 | 50.00 | лв. |
| | | | | | | 50.00 | лв. |
| | ТРУД | | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.325 | 3.80 | 1.000 | 1.23 | лв. |
| 2. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.541 | 3.80 | 1.000 | 2.06 | лв. |
| | | | | | | 3.29 | лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | м-ли | | 8.00 % | 4.00 | | | |
| | м-ция | | 25.00 % | 0.00 | | | |
| | труд | | 90.00 % | 2.96 | | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 6.96 | лв. |
| | печалба | | 7.00 % | | | 4.22 | лв. |
| | ВСИЧКО: | | | | | 64.47 | лв. |

Анализ *000000020



Почистване, изораване и фрезоване на
зелените площи;
за 1 бр.

| | | р.н. | цена | коэф. | ст-ст | |
|----|----------------------|------|---------|-------|-------|----------------------|
| 1. | МЕХАНИЗАЦИЯ ФРЕЗА | мсм | 0.002 | 56.00 | 1.000 | 0.11 лв. 0.11 лв. |
| | ТРУД | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.321 | 3.80 | 1.000 | 1.22 лв. |
| 2. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.254 | 3.80 | 1.000 | 0.97 лв. |
| | | | | | | 2.19 лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | м-ли | | 8.00 % | 0.00 | | |
| | м-ция | | 25.00 % | 0.03 | | |
| | труд | | 90.00 % | 1.97 | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 2.00 лв. |
| | печалба | | 7.00 % | | | 0.30 лв. |
| | ВСИЧКО: | | | | | 4.60 лв. |

Анализ *000000021

Внасяне на обогатен почвен субстрат
(10см);
за 1 м3

| | | р.н. | цена | коэф. | ст-ст | |
|----|---------------------------------------|------|---------|--------|-------|----------------------|
| 1. | МАТЕРИАЛИ ОБОГАТЕН ПОЧВЕН СУБСТРАТ | м3 | 1.000 | 9.00 | 1.000 | 9.00 лв. 9.00 лв. |
| | МЕХАНИЗАЦИЯ | | | | | |
| 1. | САМОСВАЛ | мсм | 0.002 | 150.00 | 1.000 | 0.30 лв. 0.30 лв. |
| | ТРУД | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.236 | 3.80 | 1.000 | 0.90 лв. |
| 2. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.224 | 3.80 | 1.000 | 0.85 лв. |
| | | | | | | 1.75 лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | м-ли | | 8.00 % | 0.72 | | |
| | м-ция | | 25.00 % | 0.08 | | |
| | труд | | 90.00 % | 1.58 | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 2.38 лв. |
| | печалба | | 7.00 % | | | 0.94 лв. |
| | ВСИЧКО: | | | | | 14.37 лв. |

Анализ *000000023

Затревяване, валиране,
поливане, торене, плевене и косене до
втора коситба вкл.



за 1 м2

| МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коэф. | ст-ст | |
|--------------|----------------|------|---------|-------|-------|----------|
| 1. | ТРЕВНО СЕМЕ | кг | 0.010 | 5.00 | 1.000 | 0.05 лв. |
| 2. | ВОДА | кг | 1.200 | 1.10 | 1.000 | 1.32 лв. |
| | | | | | | 1.37 лв. |
| МЕХАНИЗАЦИЯ | | | | | | |
| 1. | КОСАЧКА | мсм | 0.002 | 36.00 | 1.000 | 0.07 лв. |
| 2. | ВАЛЯК | мсм | 0.002 | 42.00 | 1.000 | 0.08 лв. |
| | | | | | | 0.15 лв. |
| ТРУД | | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.254 | 3.80 | 1.000 | 0.97 лв. |
| 2. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.114 | 3.80 | 1.000 | 0.43 лв. |
| | | | | | | 1.40 лв. |
| ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | м-ли | | 8.00 % | 0.11 | | |
| | м-ция | | 25.00 % | 0.04 | | |
| | труд | | 90.00 % | 1.26 | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 1.41 лв. |
| | печалба | | 7.00 % | | | 0.30 лв. |
| | ВСИЧКО: | | | | | 4.63 лв. |

Анализ *000000025

Доставка и засаждане на широколистни дървета с височина 2.5 за 1 бр.

| МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коэф. | ст-ст | |
|-------------------------------------|----------------|------|---------|-------|-------|-----------|
| ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕТА С ВИСОЧИНА 2.5 | | | | | | |
| 1. | ВИСОЧИНА 2.5 | бр. | 1.000 | 7.40 | 1.000 | 7.40 лв. |
| | | | | | | 7.40 лв. |
| ТРУД | | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.321 | 3.80 | 1.000 | 1.22 лв. |
| 2. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.112 | 3.80 | 1.000 | 0.43 лв. |
| | | | | | | 1.65 лв. |
| ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | м-ли | | 8.00 % | 0.59 | | |
| | м-ция | | 25.00 % | 0.00 | | |
| | труд | | 90.00 % | 1.48 | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 2.07 лв. |
| | печалба | | 7.00 % | | | 0.78 лв. |
| | ВСИЧКО: | | | | | 11.90 лв. |

Анализ *000000026



Доставка и засаждане на храсти с височина 0.6 - 0.8 м за 1 бр.

| МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коэф. | ст-ст | |
|--------------|-------------------------------|------|---------|-------|-------|----------|
| 1. | ХРАСТИ С ВИСОЧИНА 0.6 - 0.8 М | бр. | 1.000 | 2.50 | 1.000 | 2.50 лв. |
| | | | | | | 2.50 лв. |
| ТРУД | | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.236 | 3.80 | 1.000 | 0.90 лв. |
| 2. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.354 | 3.80 | 1.000 | 1.35 лв. |
| | | | | | | 2.25 лв. |
| ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | м-ли | | 8.00 % | 0.20 | | |
| | м-ция | | 25.00 % | 0.00 | | |
| | труд | | 90.00 % | 2.03 | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 2.23 лв. |
| | печалба | | 7.00 % | | | 0.49 лв. |
| | ВСИЧКО: | | | | | 7.47 лв. |

Анализ *000000027
Изготвяне на строителни книжа за 1 бр.

| МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коэф. | ст-ст | |
|--------------|----------------|------|---------|--------|-------|------------|
| 1. | ПРОЕКТИ | бр. | 1.000 | 500.00 | 1.000 | 500.00 лв. |
| | | | | | | 500.00 лв. |
| ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | м-ли | | 8.00 % | 40.00 | | |
| | м-ция | | 25.00 % | 0.00 | | |
| | труд | | 90.00 % | 0.00 | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 40.00 лв. |
| | печалба | | 7.00 % | | | 37.80 лв. |
| | ВСИЧКО: | | | | | 577.80 лв. |

Анализ 8103124120

ВИДИМИ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 15/25 за 1 м

| МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коэф. | ст-ст | |
|-----------|-------------------------|------|-------|--------|-------|----------|
| 1. | ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ | м3 | | 350.00 | 1.000 | 0.03 лв. |
| 2. | ПИРОНИ | кг | 0.036 | 1.20 | 1.000 | 0.04 лв. |
| 3. | БЕТОН М 150 - ОБИКНОВЕН | м3 | 0.002 | 70.00 | 1.000 | 0.14 лв. |



| | | | | | | | |
|----|------------------------|------|---------|--------|-------|-------|-----|
| 4. | ГРЕДИ ИГЛОЛИСТНИ | м3 | 0.001 | 250.00 | 1.000 | 0.32 | лв. |
| 5. | РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1.5 | м3 | 0.005 | 65.00 | 1.000 | 0.29 | лв. |
| 6. | БОРДЮРИ БЕТОНОВИ 15/25 | м | 1.000 | 6.30 | 1.000 | 6.30 | лв. |
| | | | | | | 7.12 | лв. |
| | ТРУД | | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК II ст. | ч.ч. | 0.176 | 3.80 | 1.000 | 0.67 | лв. |
| 2. | РАБОТНИК III ст. | ч.ч. | 0.210 | 3.80 | 1.000 | 0.80 | лв. |
| | | | | | | 1.47 | лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | м-ли | | 8.00 % | 0.57 | | | |
| | м-ция | | 25.00 % | 0.00 | | | |
| | труд | | 90.00 % | 1.32 | | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 1.89 | лв. |
| | печалба | | 7.00 % | | | 0.73 | лв. |
| | ВСИЧКО: | | | | | 11.21 | лв. |

Анализ 8454530000
 ПЛОЧНИЦИ С НОВИ БАЗАЛТОВИ
 /БЕТОННИ/ ПЛОЧИ 300/300/50-
 ОЦВЕТЕНИ НАД 5Мэ
 за 1 м2

| | МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коэф. | ст-ст | |
|----|-----------------------------|------|---------|--------|-------|-------|-----|
| 1. | ПЯСЪК | м3 | 0.055 | 8.00 | 1.000 | 0.44 | лв. |
| 2. | ПЛОЧИ БАЗАЛТОВИ И ЦИМЕНТОВИ | бр. | 11.500 | 0.32 | 1.000 | 3.68 | лв. |
| 3. | ЦИМЕНТ М-350 | тона | 0.008 | 250.00 | 1.000 | 2.00 | лв. |
| | | | | | | 6.12 | лв. |
| | ТРУД | | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК II ст. | ч.ч. | 0.511 | 3.80 | 1.000 | 1.94 | лв. |
| 2. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.248 | 3.80 | 1.000 | 0.94 | лв. |
| | | | | | | 2.88 | лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | м-ли | | 8.00 % | 0.49 | | | |
| | м-ция | | 25.00 % | 0.00 | | | |
| | труд | | 90.00 % | 2.59 | | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 3.08 | лв. |
| | печалба | | 7.00 % | | | 0.85 | лв. |
| | ВСИЧКО: | | | | | 12.93 | лв. |

Анализ 8102071040
 ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН М150 ЗА
 ОСНОВИ НА СТЕНИ, КОЛОНИ И
 ФУНДАМЕНТНИ ПЛОЧИ-ККРАН
 за 1 м3

| МАТЕРИАЛИ | р.н. | цена | коэф. | ст-ст |
|-----------|------|------|-------|-------|
|-----------|------|------|-------|-------|



00110

| | | | | | | | |
|----|-------------------------|------|---------|-------|-------|-------|-----|
| 1. | БЕТОН М 150 - ОБИКНОВЕН | м3 | 1.015 | 70.00 | 1.000 | 71.05 | лв. |
| | | | | | | 71.05 | лв. |
| | ТРУД | | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.521 | 3.80 | 1.000 | 1.98 | лв. |
| 2. | БЕТОНДЖИЯ III ст. | ч.ч. | 0.714 | 3.80 | 1.000 | 2.71 | лв. |
| | | | | | | 4.69 | лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | м-ли | | 8.00 % | 5.68 | | | |
| | м-ция | | 25.00 % | 0.00 | | | |
| | труд | | 90.00 % | 4.22 | | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 9.90 | лв. |
| | печалба | | 7.00 % | | | 5.99 | лв. |
| | ВСИЧКО: | | | | | 91.63 | лв. |

Анализ 8103308240

ПОЛАГАНЕ БЕТОН М300 ЗА АРМИРАНИ
ПЛОЧИ И ГРЕДИ-ХАСПЕЛ
за 1 м3

| | | | | | | | |
|----|--|------|---------|-------|-------|--------|-----|
| | МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коэф. | ст-ст | |
| 1. | БЕТОН М 300 - ОБИКНОВЕН | м3 | 1.015 | 70.00 | 1.000 | 71.05 | лв. |
| | | | | | | 71.05 | лв. |
| | МЕХАНИЗАЦИЯ | | | | | | |
| | ВИБРАТОР ИГЛЕН ВГРАДЕН | | | | | | |
| 1. | ЕЛ.ДВИГАТЕЛ И ПРЕОБРА СТР.МАЧТОВ ПОДЕМНИК С УСРЕДНЕНА | мсм | 0.080 | 0.00 | 1.000 | 0.00 | лв. |
| 2. | ЦЕНА ЗА УСН- | мсм | 0.080 | 25.00 | 1.000 | 2.00 | лв. |
| | | | | | | 2.00 | лв. |
| | ТРУД | | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.200 | 3.80 | 1.000 | 0.76 | лв. |
| 2. | РАБОТНИК II ст. | ч.ч. | 0.987 | 3.80 | 1.000 | 3.75 | лв. |
| 3. | РАБОТНИК III ст. | ч.ч. | 0.790 | 3.80 | 1.000 | 3.00 | лв. |
| | | | | | | 7.51 | лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | м-ли | | 8.00 % | 5.68 | | | |
| | м-ция | | 25.00 % | 0.50 | | | |
| | труд | | 90.00 % | 6.76 | | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 12.94 | лв. |
| | печалба | | 7.00 % | | | 6.55 | лв. |
| | ВСИЧКО: | | | | | 100.05 | лв. |

Анализ 8101106111



ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 0.6М -
 РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕНИ
 Н=или<2М
 за 1 м3

| | ТРУД | р.н. | цена | коэф. | ст-ст | |
|--------------|-----------------|------------|------|-------|-------|-----|
| 1. | ИЗКОПЧИЯ II ст. | ч.ч. 0.354 | 3.80 | 1.000 | 1.35 | лв. |
| 2. | ИЗКОПЧИЯ I ст. | ч.ч. 0.356 | 3.80 | 1.000 | 1.35 | лв. |
| | | | | | 2.70 | лв. |
| ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | м-ли | 8.00 % | 0.00 | | | |
| | м-ция | 25.00 % | 0.00 | | | |
| | труд | 90.00 % | 2.43 | | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | 2.43 | лв. |
| | печалба | 7.00 % | | | 0.36 | лв. |
| | ВСИЧКО: | | | | 5.49 | лв. |


15.04.2016 г.

Велко Руйков



Количествено-стойностна сметка

| ОБЩИНА ПЕРНИК, ОБЛАСТ ПЕРНИК | | | | | |
|---|---|----------|------------|---------------|-----------|
| ОБЕКТ: Детски площадки, включени в Поименния списък на капиталовите разходи за 2016г. | | | | | |
| № по ред | Описание на строително-монтажни работи | Ед.мярка | Количество | Единична цена | Обща цена |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Детски площадки в гр. Перник | | | | | |
| | ПОДОБЕКТ 4: УПИ 3а Озеленяване, кв. 9157 - пред IX-то ОУ, Твърди Ливади | | | | |
| | | | | | |
| 1 | Демонтаж и извозване на съществуващи детски съоръжения | бр. | 6.00 | 7.13 | 42.78 |
| 2 | Доставка и полагане на градински бетонов бордюру - сив цвят; | м | 15.00 | 25.87 | 388.05 |
| 3 | Доставка и монтаж на дървени пейки с метална конструкция и облегалка (размери 180/50/82см); | бр. | 2.00 | 301.91 | 603.82 |
| 4 | Доставка и монтаж на кошчета за отпадъци р-р 45/80см; | бр. | 2.00 | 127.37 | 254.74 |
| 5 | Доставка и полагане на противоударна настилка в детска площадка, в т.ч. подложен бетон 10 см | м2 | 46.00 | 51.78 | 2381.88 |
| 6 | Детска пързалка | бр. | 1.00 | 2100.09 | 2100.09 |
| 7 | Комбинирана детска люлка с две места за люлеене тип махало | бр. | 1.00 | 2234.67 | 2234.67 |
| 8 | Детска клатушка | бр. | 2.00 | 1142.11 | 2284.22 |
| 9 | Изкоп за детски пясъчник на 40 см дълбочина | м3 | 1.60 | 9.33 | 14.93 |
| 10 | Доставка и полагане на бетон по контур на детски пясъчник вкл. кофраж и армировка | м3 | 8.00 | 181.02 | 1448.16 |
| 11 | Полагане на геотекстил и чакъл с фракция, по-голяма от 8 mm, за дренаж под настилки от пясък с дебелина на слоя не по-малко от 10 см; | м2 | 4.00 | 2.58 | 10.32 |
| 12 | Доставка и разстилане на промит пясък с фракция от 0,2 до 2 mm (дебелина 30см); | м3 | 1.20 | 21.49 | 25.79 |
| 13 | Доставка и монтаж на дървена шапка по контур на детски пясъчник | м | 8.00 | 14.44 | 115.52 |
| 14 | Доставка и монтаж на дървена предпазна ограда с височина 1.00м ; с две врати широки 1.00м | м | 30.00 | 69.19 | 2075.70 |
| 15 | Доставка и монтаж на Информационна табела (мин.110/150 см.) | бр. | 1.00 | 145.36 | 145.36 |
| 16 | Почистване, изораване и фрезование на зелените площи; | м2 | 20.00 | 21.65 | 433.00 |
| 17 | Внасяне на обогатен почвен субстрат (10см); | м3 | 2.00 | 28.12 | 56.24 |
| 18 | Провеждане на санитарни и оформящи резитби на съществуващи храсти;вкл.извозване | м2 | 5.00 | 12.42 | 62.10 |

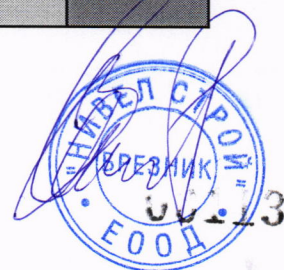

| | | | | | |
|----|---|-----|-------|---------|---------|
| 19 | Провеждане на санитарни и оформящи резитби на съществуващи широколистни дървета;вкл.извозване | бр. | 5.00 | 11.10 | 55.50 |
| 20 | Затревяване,валиране, поливане,торене,плевене и косене до втора коситба вкл. | м2 | 20.00 | 8.60 | 172.00 |
| 21 | Доставка и засаждане на иглолистни дървета с височина 1.5 м. | бр. | 3.00 | 12.33 | 36.99 |
| 22 | Доставка и засаждане на широколистни дървета с височина 2.5 | бр. | 3.00 | 15.13 | 45.39 |
| 23 | Доставка и засаждане на храсти с височина 0.6 - 0.8 м | бр. | 20.00 | 8.51 | 170.20 |
| 24 | Изготвяне на строителни книжа | бр. | 1.00 | 1271.16 | 1271.16 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|-----------------|
| ВСИЧКО: | | | | | 16428.61 |
|----------------|--|--|--|--|-----------------|

15.04.2016 г.

Велко Руйков



00114

ПОДОБЕКТ 4: УПИ За озеленяване, кв. 9157 - пред IX - то, Твърди ливади

АНАЛИЗИ

Анализ *000000004

Демонтаж и извозване на
съществуващи детски съоръжения
за 1 бр.

| | | р.н. | цена | коэф. | ст-ст | |
|----|-------------------------|------|---------|--------|-------|--------------|
| 1. | МЕХАНИЗАЦИЯ САМОСВАЛ | мсм | 0.004 | 150.00 | 1.000 | 0.60 0.60 |
| | ТРУД | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.365 | 3.80 | 1.000 | 1.39 |
| 2. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.452 | 3.80 | 1.000 | 1.72 |
| | | | | | | 3.11 |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | м-ли | | 8.00 % | 0.00 | | |
| | м-ция | | 25.00 % | 0.15 | | |
| | труд | | 90.00 % | 2.80 | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 2.95 |
| | печалба | | 7.00 % | | | 0.47 |
| | ВСИЧКО: | | | | | 7.13 |

Анализ *000000005

Доставка и полагане на градински
бетон бордюри - сив цвят;
за 1 м

| | | р.н. | цена | коэф. | ст-ст | |
|----|--------------------------------------|------|---------|--------|-------|-------|
| 1. | МАТЕРИАЛИ БОРДЮРИ БЕТОНОВИ - 8/10 | м | 1.000 | 15.00 | 1.000 | 15.00 |
| 2. | БЕТОН М 100 - ОБИКНОВЕН | м3 | 0.003 | 100.00 | 1.000 | 0.25 |
| | | | | | | 15.25 |
| | ТРУД | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.654 | 3.80 | 1.000 | 2.49 |
| 2. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.412 | 3.80 | 1.000 | 1.57 |
| | | | | | | 4.06 |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | м-ли | | 8.00 % | 1.22 | | |
| | м-ция | | 25.00 % | 0.00 | | |
| | труд | | 90.00 % | 3.65 | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 4.87 |
| | печалба | | 7.00 % | | | 1.69 |
| | ВСИЧКО: | | | | | 25.87 |

Анализ *000000006



Доставка и монтаж на дървени пейки с метална конструкция и облегалка (размери за 1 бр.

| МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коэф. | ст-ст | |
|--------------|---|------|---------|--------|-------|------------------|
| 1. | ДЪРВЕНИ ПЕЙКИ С МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ И ОБЛЕГАЛКА | бр. | 1.000 | 250.00 | 1.000 | 250.00 250.00 |
| ТРУД | | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.698 | 3.80 | 1.000 | 2.65 |
| 2. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.987 | 3.80 | 1.000 | 3.75 |
| ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | м-ли | | 8.00 % | 20.00 | | |
| | м-ция | | 25.00 % | 0.00 | | |
| | труд | | 90.00 % | 5.76 | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 25.76 |
| | печалба | | 7.00 % | | | 19.75 |
| | ВСИЧКО: | | | | | 301.91 |

Анализ *000000007

Доставка и монтаж на кошчета за отпадъци р-р 45/80см; за 1 бр.

| МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коэф. | ст-ст | |
|--------------|----------------------------------|------|---------|--------|-------|------------------|
| 1. | КОШЧЕТА ЗА ОТПАДЪЦИ Р-Р 45/80СМ; | бр. | 1.000 | 100.00 | 1.000 | 100.00 100.00 |
| ТРУД | | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.654 | 3.80 | 1.000 | 2.49 |
| 2. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.875 | 3.80 | 1.000 | 3.32 |
| ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | м-ли | | 8.00 % | 8.00 | | |
| | м-ция | | 25.00 % | 0.00 | | |
| | труд | | 90.00 % | 5.23 | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 13.23 |
| | печалба | | 7.00 % | | | 8.33 |
| | ВСИЧКО: | | | | | 127.37 |

Анализ *000000009

Доставка и полагане на противоударна настилка в детска площадка, в т.ч. подложе за 1 м2



00116

| | МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коэф. | ст-ст |
|--------------|------------------------|------|---------|-------|-------|----------------|
| 1. | ПРОТИВОУДАРНА НАСТИЛКА | м2 | 1.000 | 38.00 | 1.000 | 38.00 38.00 |
| ТРУД | | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.365 | 3.80 | 1.000 | 1.39 |
| 2. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.652 | 3.80 | 1.000 | 2.48 3.87 |
| ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | м-ли | | 8.00 % | 3.04 | | |
| | м-ция | | 25.00 % | 0.00 | | |
| | труд | | 90.00 % | 3.48 | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 6.52 |
| | печалба | | 7.00 % | | | 3.39 |
| | ВСИЧКО: | | | | | 51.78 |

Анализ *000000010
Детска пързалка
за 1 бр.

| | МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коэф. | ст-ст |
|--------------|-----------------|------|---------|----------|-------|----------------------|
| 1. | ДЕТСКА ПЪРЗАЛКА | бр. | 1.000 | 1 800.00 | 1.000 | 1 800.00 1 800.00 |
| ТРУД | | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 1.230 | 3.80 | 1.000 | 4.67 |
| 2. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 1.360 | 3.80 | 1.000 | 5.17 9.84 |
| ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | м-ли | | 8.00 % | 144.00 | | |
| | м-ция | | 25.00 % | 0.00 | | |
| | труд | | 90.00 % | 8.86 | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 152.86 |
| | печалба | | 7.00 % | | | 137.39 |
| | ВСИЧКО: | | | | | 2 100.09 |

Анализ *000000011
Комбинирана детска люлка с две
места за люлеене тип махало
за 1 бр.

| | МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коэф. | ст-ст |
|------|--|------|-------|----------|-------|----------------------|
| 1. | КОМБИНИРАНА ДЕТСКА ЛЮЛКА С ДВЕ МЕСТА ЗА ЛЮЛЕЕНЕ ТИП | бр. | 1.000 | 1 900.00 | 1.000 | 1 900.00 1 900.00 |
| ТРУД | | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 2.365 | 3.80 | 1.000 | 8.99 |
| 2. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 2.687 | 3.80 | 1.000 | 10.21 |



| | | | | | |
|----------------|---------|--------|--|--|----------|
| | | | | | 19.20 |
| ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| м-ли | 8.00 % | 152.00 | | | |
| м-ция | 25.00 % | 0.00 | | | |
| труд | 90.00 % | 17.28 | | | |
| доп.р-ди (вс.) | | | | | 169.28 |
| печалба | 7.00 % | | | | 146.19 |
| ВСИЧКО: | | | | | 2 234.67 |

Анализ *000000012

Детска клатушка
за 1 бр.

| МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коеф. | ст-ст | |
|-----------|-----------------|------|-------|--------|-------|--------|
| 1. | ДЕТСКА КЛАТУШКА | бр. | 1.000 | 980.00 | 1.000 | 980.00 |
| | | | | | | 980.00 |
| ТРУД | | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.687 | 3.80 | 1.000 | 2.61 |
| 2. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.558 | 3.80 | 1.000 | 2.12 |
| | | | | | | 4.73 |

ДОП.РАЗХОДИ:

| | | | | | |
|----------------|---------|-------|--|--|----------|
| м-ли | 8.00 % | 78.40 | | | |
| м-ция | 25.00 % | 0.00 | | | |
| труд | 90.00 % | 4.26 | | | |
| доп.р-ди (вс.) | | | | | 82.66 |
| печалба | 7.00 % | | | | 74.72 |
| ВСИЧКО: | | | | | 1 142.11 |

Анализ *000000013

Изкоп за детски пясъчник на 40 см
дълбочина
за 1 м3

| ТРУД | | р.н. | цена | коеф. | ст-ст | |
|------|----------------|------|-------|-------|-------|------|
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.652 | 3.80 | 1.000 | 2.48 |
| 2. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.554 | 3.80 | 1.000 | 2.11 |
| | | | | | | 4.59 |

ДОП.РАЗХОДИ:

| | | | | | |
|----------------|---------|------|--|--|------|
| м-ли | 8.00 % | 0.00 | | | |
| м-ция | 25.00 % | 0.00 | | | |
| труд | 90.00 % | 4.13 | | | |
| доп.р-ди (вс.) | | | | | 4.13 |
| печалба | 7.00 % | | | | 0.61 |
| ВСИЧКО: | | | | | 9.33 |



Анализ *000000014

Доставка и полагане на бетон по контур на детски пясъчник вкл. кофраж и армиров за 1 м3

| | МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коеф. | ст-ст |
|----|--|------|---------|--------|-------|--------|
| 1. | БЕТОН В15 | м3 | 1.000 | 120.00 | 1.000 | 120.00 |
| 2. | АРМИРОВКА СТОМАНА Аt С ДИАМЕТЪР ДО 12ММ | кг | 20.000 | 1.20 | 1.000 | 24.00 |
| | | | | | | 144.00 |
| | ТРУД | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.654 | 3.80 | 1.000 | 2.49 |
| 2. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 1.236 | 3.80 | 1.000 | 4.70 |
| | | | | | | 7.19 |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | м-ли | | 8.00 % | 11.52 | | |
| | м-ция | | 25.00 % | 0.00 | | |
| | труд | | 90.00 % | 6.47 | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 17.99 |
| | печалба | | 7.00 % | | | 11.84 |
| | ВСИЧКО: | | | | | 181.02 |

Анализ *000000015

Полагане на геотекстил и чакъл с фракция, по-голяма от 8 mm, за дренаж под наст за 1 м2

| | МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коеф. | ст-ст |
|----|----------------|------|---------|------|-------|-------|
| 1. | ГЕОТЕКСТИЛ | м2 | 1.000 | 1.80 | 1.000 | 1.80 |
| | | | | | | 1.80 |
| | ТРУД | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.052 | 3.80 | 1.000 | 0.20 |
| 2. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.012 | 3.80 | 1.000 | 0.05 |
| | | | | | | 0.25 |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | м-ли | | 8.00 % | 0.14 | | |
| | м-ция | | 25.00 % | 0.00 | | |
| | труд | | 90.00 % | 0.22 | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 0.36 |
| | печалба | | 7.00 % | | | 0.17 |
| | ВСИЧКО: | | | | | 2.58 |

Анализ *000000016



Доставка и разстилане на промит
 пясък с фракция от 0,2 до 2 mm
 (дебелина 30см);
 за 1 м3

| | | р.н. | цена | коэф. | ст-ст | |
|----|---|------|---------|-------|-------|----------------|
| 1. | МАТЕРИАЛИ ПРОМИТ ПЯСЪК С ФРАКЦИЯ ОТ 0,2 ДО 2 ММ | м3 | 1.000 | 15.00 | 1.000 | 15.00 15.00 |
| | ТРУД | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.325 | 3.80 | 1.000 | 1.23 |
| 2. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.214 | 3.80 | 1.000 | 0.81 |
| | | | | | | 2.04 |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | м-ли | | 8.00 % | 1.20 | | |
| | м-ция | | 25.00 % | 0.00 | | |
| | труд | | 90.00 % | 1.84 | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 3.04 |
| | печалба | | 7.00 % | | | 1.41 |
| | ВСИЧКО: | | | | | 21.49 |

Анализ *000000017
 Доставка и монтаж на дървена
 шапка по контур на детски
 за 1 м

| | | р.н. | цена | коэф. | ст-ст | |
|----|----------------------------|------|---------|-------|-------|----------------|
| 1. | МАТЕРИАЛИ ДЪРВЕНА ШАПКА | м | 1.000 | 10.00 | 1.000 | 10.00 10.00 |
| | ТРУД | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.230 | 3.80 | 1.000 | 0.87 |
| 2. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.145 | 3.80 | 1.000 | 0.55 |
| | | | | | | 1.42 |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | м-ли | | 8.00 % | 0.80 | | |
| | м-ция | | 25.00 % | 0.00 | | |
| | труд | | 90.00 % | 1.28 | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 2.08 |
| | печалба | | 7.00 % | | | 0.94 |
| | ВСИЧКО: | | | | | 14.44 |

Анализ *000000018
 Доставка и монтаж на дървена
 предпазна ограда с височина 1.00м
 ; с две врати ши
 за 1 м






| | МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коэф. | ст-ст |
|--------------|--------------------------|------|---------|-------|-------|----------------|
| 1. | ДЪРВЕНА ПРЕДПАЗНА ОГРАДА | м | 1.000 | 56.00 | 1.000 | 56.00 56.00 |
| ТРУД | | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.365 | 3.80 | 1.000 | 1.39 |
| 2. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.214 | 3.80 | 1.000 | 0.81 2.20 |
| ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | м-ли | | 8.00 % | 4.48 | | |
| | м-ция | | 25.00 % | 0.00 | | |
| | труд | | 90.00 % | 1.98 | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 6.46 |
| | печалба | | 7.00 % | | | 4.53 |
| | ВСИЧКО: | | | | | 69.19 |

Анализ *000000019
Доставка и монтаж на
Информационна табела
(мин.110/150 см.)
за 1 бр.

| | МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коэф. | ст-ст |
|--------------|----------------------|------|---------|--------|-------|------------------|
| 1. | ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА | бр. | 1.000 | 120.00 | 1.000 | 120.00 120.00 |
| ТРУД | | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.325 | 3.80 | 1.000 | 1.23 |
| 2. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.541 | 3.80 | 1.000 | 2.06 3.29 |
| ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | м-ли | | 8.00 % | 9.60 | | |
| | м-ция | | 25.00 % | 0.00 | | |
| | труд | | 90.00 % | 2.96 | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 12.56 |
| | печалба | | 7.00 % | | | 9.51 |
| | ВСИЧКО: | | | | | 145.36 |

Анализ *000000020
Почистване, изораване и
фрезование на зелените площи;
за 1 бр.

| | МЕХАНИЗАЦИЯ | | р.н. | цена | коэф. | ст-ст |
|------|-------------|-----|-------|-------|-------|--------------|
| 1. | ФРЕЗА | мсм | 0.020 | 56.00 | 1.000 | 1.12 1.12 |
| ТРУД | | | | | | |

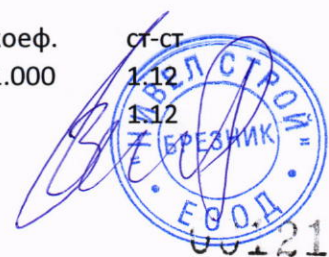

| | | | | | | |
|--------------|----------------|------|---------|------|-------|-------|
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 1.241 | 3.80 | 1.000 | 4.72 |
| 2. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 1.365 | 3.80 | 1.000 | 5.19 |
| | | | | | | 9.91 |
| ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | м-ли | | 8.00 % | 0.00 | | |
| | м-ция | | 25.00 % | 0.28 | | |
| | труд | | 90.00 % | 8.92 | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 9.20 |
| | печалба | | 7.00 % | | | 1.42 |
| | ВСИЧКО: | | | | | 21.65 |

Анализ *000000021
Внасяне на обогатен почвен
субстрат (10см);
за 1 м3

| | | | | | | |
|--------------|--------------------------|------|---------|--------|-------|-------|
| | МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коеф. | ст-ст |
| 1. | ОБОГАТЕН ПОЧВЕН СУБСТРАТ | м3 | 1.000 | 18.00 | 1.000 | 18.00 |
| | | | | | | 18.00 |
| МЕХАНИЗАЦИЯ | | | | | | |
| 1. | САМОСВАЛ | мсм | 0.002 | 150.00 | 1.000 | 0.30 |
| | | | | | | 0.30 |
| ТРУД | | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.236 | 3.80 | 1.000 | 0.90 |
| 2. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.658 | 3.80 | 1.000 | 2.50 |
| | | | | | | 3.40 |
| ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | м-ли | | 8.00 % | 1.44 | | |
| | м-ция | | 25.00 % | 0.08 | | |
| | труд | | 90.00 % | 3.06 | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 4.58 |
| | печалба | | 7.00 % | | | 1.84 |
| | ВСИЧКО: | | | | | 28.12 |

Анализ *000000022
Провеждане на санитарни и
оформящи резитби на
съществуващи широколистни
дървета
за 1 бр.

| | | | | | | |
|--------------|----------------|------|-------|------|-------|-------|
| | ТРУД | | р.н. | цена | коеф. | ст-ст |
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.874 | 3.80 | 1.000 | 3.32 |
| 2. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.562 | 3.80 | 1.000 | 2.14 |
| | | | | | | 5.46 |
| ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |




| | | | |
|----------------|---------|------|-------|
| м-ли | 8.00 % | 0.00 | |
| м-ция | 25.00 % | 0.00 | |
| ТРУД | 90.00 % | 4.91 | |
| доп.р-ди (вс.) | | | 4.91 |
| печалба | 7.00 % | | 0.73 |
| ВСИЧКО: | | | 11.10 |

Анализ *000000023
Затревяване,валиране,
поливане,торене,плевене и косене
до втора коситба вкл.
за 1 м2

| МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коэф. | ст-ст | |
|--------------|----------------|---------|-------|-------|-------|------|
| 1. | ТРЕВНО СЕМЕ | кг | 0.010 | 10.20 | 1.000 | 0.10 |
| 2. | ВОДА | кг | 1.200 | 1.10 | 1.000 | 1.32 |
| | | | | | | 1.42 |
| МЕХАНИЗАЦИЯ | | | | | | |
| 1. | КОСАЧКА | МСМ | 0.004 | 36.00 | 1.000 | 0.14 |
| 2. | ВАЛЯК | МСМ | 0.004 | 42.00 | 1.000 | 0.17 |
| | | | | | | 0.31 |
| ТРУД | | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.325 | 3.80 | 1.000 | 1.23 |
| 2. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.524 | 3.80 | 1.000 | 1.99 |
| | | | | | | 3.22 |
| ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | м-ли | 8.00 % | 0.11 | | | |
| | м-ция | 25.00 % | 0.08 | | | |
| | ТРУД | 90.00 % | 2.90 | | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 3.09 |
| | печалба | 7.00 % | | | | 0.56 |
| | ВСИЧКО: | | | | | 8.60 |

Анализ *000000024
Доставка и засаждане на
иглолистни дървета с височина 1.5
м.
за 1 бр.

| МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коэф. | ст-ст | |
|-----------|---|------|-------|-------|-------|------|
| 1. | ИГЛОЛИСТНИ ДЪРВЕТА С ВИСОЧИНА 1.5 М. | бр. | 1.000 | 6.80 | 1.000 | 6.80 |
| | | | | | | 6.80 |
| ТРУД | | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.324 | 3.80 | 1.000 | 1.23 |
| 2. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.254 | 3.80 | 1.000 | 0.97 |

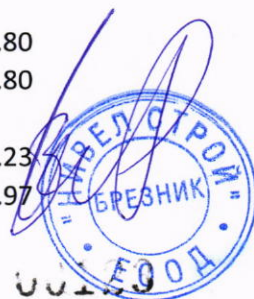

| | | | | | |
|----------------|---------|------|--|--|-------|
| ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | 2.20 |
| м-ли | 8.00 % | 0.54 | | | |
| м-ция | 25.00 % | 0.00 | | | |
| труд | 90.00 % | 1.98 | | | |
| доп.р-ди (вс.) | | | | | 2.52 |
| печалба | 7.00 % | | | | 0.81 |
| ВСИЧКО: | | | | | 12.33 |

Анализ *000000025
Доставка и засаждане на широколистни дървета с височина 2.5 за 1 бр.

| | МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коэф. | ст-ст |
|----|-------------------------------------|------|-------|------|-------|-------|
| 1. | ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕТА С ВИСОЧИНА 2.5 | бр. | 1.000 | 8.50 | 1.000 | 8.50 |
| | | | | | | 8.50 |
| | ТРУД | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.321 | 3.80 | 1.000 | 1.22 |
| 2. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.365 | 3.80 | 1.000 | 1.39 |
| | | | | | | 2.61 |

| | | | | | |
|----------------|---------|------|--|--|-------|
| ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| м-ли | 8.00 % | 0.68 | | | |
| м-ция | 25.00 % | 0.00 | | | |
| труд | 90.00 % | 2.35 | | | |
| доп.р-ди (вс.) | | | | | 3.03 |
| печалба | 7.00 % | | | | 0.99 |
| ВСИЧКО: | | | | | 15.13 |

Анализ *000000026
Доставка и засаждане на храсти с височина 0.6 - 0.8 м за 1 бр.

| | МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коэф. | ст-ст |
|----|-------------------------------|------|-------|------|-------|-------|
| 1. | ХРАСТИ С ВИСОЧИНА 0.6 - 0.8 М | бр. | 1.000 | 3.40 | 1.000 | 3.40 |
| | | | | | | 3.40 |
| | ТРУД | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.236 | 3.80 | 1.000 | 0.90 |
| 2. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.354 | 3.80 | 1.000 | 1.35 |
| | | | | | | 2.25 |

| | | | | | |
|--------------|---------|------|--|--|--|
| ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| м-ли | 8.00 % | 0.27 | | | |
| м-ция | 25.00 % | 0.00 | | | |



| | | | |
|----------------|---------|------|------|
| труд | 90.00 % | 2.03 | |
| доп.р-ди (вс.) | | | 2.30 |
| печалба | 7.00 % | | 0.56 |
| ВСИЧКО: | | | 8.51 |

Анализ *000000027
Изготвяне на строителни книжа
за 1 бр.

| | | | | | | |
|----|----------------------|-----|---------------|------------------|----------------|-------------------------------|
| 1. | МАТЕРИАЛИ ПРОЕКТИ | бр. | р.н. 1.000 | цена 1 100.00 | коэф. 1.000 | ст-ст 1 100.00 1 100.00 |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | м-ли | | 8.00 % | 88.00 | | |
| | м-ция | | 25.00 % | 0.00 | | |
| | труд | | 90.00 % | 0.00 | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 88.00 |
| | печалба | | 7.00 % | | | 83.16 |
| | ВСИЧКО: | | | | | 1 271.16 |

Анализ *000000001
Провеждане на санитарни и
оформящи резитби на
съществуващи храсти вкл. извовзан
за 1 бр.

| | | | | | | |
|----|-------------------------|------|---------------|----------------|----------------|-----------------------|
| 1. | МЕХАНИЗАЦИЯ САМОСВАЛ | мсм | р.н. 0.002 | цена 150.00 | коэф. 1.000 | ст-ст 0.30 0.30 |
| | ТРУД | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.658 | 3.80 | 1.000 | 2.50 |
| 2. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.896 | 3.80 | 1.000 | 3.41 |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | м-ли | | 8.00 % | 0.00 | | |
| | м-ция | | 25.00 % | 0.08 | | |
| | труд | | 90.00 % | 5.32 | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 5.40 |
| | печалба | | 7.00 % | | | 0.81 |
| | ВСИЧКО: | | | | | 12.42 |

15.04.2016 г

Велко Руйков



00125

Количествено-стойностна сметка

| ОБЩИНА ПЕРНИК, ОБЛАСТ ПЕРНИК | | | | | |
|---|---|----------|------------|---------------|-----------|
| ОБЕКТ: Детски площадки, включени в Поименния списък на капиталовите разходи за 2016г. | | | | | |
| № по ред | Описание на строително-монтажни работи | Ед.мярка | Количество | Единична цена | Обща цена |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Детски площадки в гр. Перник | | | | |
| | ПОДОБЕКТ 5: УПИ 3а обществена градина и стопански дейности, кв. 251 - УЛ. КРАКРА, т. нар. "Банята" | | | | |
| | | | | | |
| 1 | Демонтаж и извозване на съществуващи детски съоръжения | бр. | 6.00 | 7.13 | 42.78 |
| 2 | Доставка и полагане на градински бетонов бордюр - сив цвят; | м | 15.00 | 25.87 | 388.05 |
| 3 | Доставка и монтаж на дървени пейки с метална конструкция и облегалка (размери 180/50/82см); | бр. | 2.00 | 301.91 | 603.82 |
| 4 | Доставка и монтаж на кошчета за отпадъци р-р 45/80см; | бр. | 2.00 | 127.37 | 254.74 |
| 5 | Доставка и полагане на противоударна настилка в детска площадка | м2 | 46.00 | 51.78 | 2381.88 |
| 6 | Детска пързалка | бр. | 1.00 | 2100.09 | 2100.09 |
| 7 | Комбинирана детска люлка с две места за люлеене тип махало | бр. | 1.00 | 2234.67 | 2234.67 |
| 8 | Детска клатушка | бр. | 2.00 | 1142.11 | 2284.22 |
| 9 | Изкоп за детски пясъчник на 40 см дълбочина | м3 | 1.60 | 9.33 | 14.93 |
| 10 | Доставка и полагане на бетон по контур на детски пясъчник вкл. кофраж и армировка | м3 | 8.00 | 181.02 | 1448.16 |
| 11 | Полагане на геотекстил и чакъл с фракция, по-голяма от 8 mm, за дренаж под настилки от пясък с дебелина на слоя не по-малко от 10 см; | м2 | 4.00 | 2.58 | 10.32 |
| 12 | Доставка и разстилане на промит пясък с фракция от 0,2 до 2 mm (дебелина 30см); | м3 | 1.20 | 21.49 | 25.79 |
| 13 | Доставка и монтаж на дървена шапка по контур на детски пясъчник | м | 8.00 | 14.44 | 115.52 |
| 14 | Доставка и монтаж на дървена предпазна ограда с височина 1.00м ; с две врати широки 1.00м | м | 30.00 | 69.19 | 2075.70 |
| 15 | Доставка и монтаж на Информационна табела (мин.110/150 см.) | бр. | 1.00 | 145.36 | 145.36 |
| 16 | Почистване, изораване и фрезование на зелените площи; | м2 | 20.00 | 21.65 | 433.00 |
| 17 | Внасяне на обогатен почвен субстрат (10см); | м3 | 2.00 | 28.12 | 56.24 |
| 18 | Провеждане на санитарни и оформящи резитби на съществуващи храсти;вкл.извозване | м2 | 5.00 | 12.42 | 62.10 |
| 19 | Провеждане на санитарни и оформящи резитби на съществуващи широколистни дървета;вкл.извозване | бр. | 5.00 | 1.10 | 5.50 |



| | | | | | |
|----|--|-----|-------|---------|---------|
| 20 | Затревяване,валиране, поливане,торене,плевене и косене до втора коситба вкл. | м2 | 20.00 | 8.60 | 172.00 |
| 21 | Доставка и засаждане на иглолистни дървета с височина 1.5 м. | бр. | 3.00 | 12.33 | 36.99 |
| 22 | Доставка и засаждане на широколистни дървета с височина 2.5 | бр. | 3.00 | 15.13 | 45.39 |
| 23 | Доставка и засаждане на храсти с височина 0.6 - 0.8 м | бр. | 20.00 | 8.51 | 170.20 |
| 24 | Изготвяне на строителни книжа | бр. | 1.00 | 1271.16 | 1271.16 |

| | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|-----------------|
| ВСИЧКО: | | | | | 16378.61 |
|----------------|--|--|--|--|-----------------|

15.04.2016 г.

Велко Руйков:



00127

ПОДОБЕКТ 5: УПИ За обществена градина и стопански дейности, кв. 251 - УЛ. КРАКРА, т. нар.
"Банята"

АНАЛИЗИ

Анализ *000000004


Демонтаж и извозване на
съществуващи детски съоръжения
за 1 бр.

| | | р.н. | цена | коеф. | ст-ст | | |
|----|----------------|------|---------|--------|-------|------|-----|
| 1. | МЕХАНИЗАЦИЯ | | | | | | |
| | САМОСВАЛ | мсм | 0.004 | 150.00 | 1.000 | 0.60 | лв. |
| | | | | | | 0.60 | лв. |
| | ТРУД | | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.365 | 3.80 | 1.000 | 1.39 | лв. |
| 2. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.452 | 3.80 | 1.000 | 1.72 | лв. |
| | | | | | | 3.11 | лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | м-ли | | 8.00 % | 0.00 | | | |
| | м-ция | | 25.00 % | 0.15 | | | |
| | труд | | 90.00 % | 2.80 | | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 2.95 | лв. |
| | печалба | | 7.00 % | | | 0.47 | лв. |
| | ВСИЧКО: | | | | | 7.13 | лв. |

Анализ *000000005

Доставка и полагане на градински
бетонов бордюру - сив цвят;
за 1 м

| | | р.н. | цена | коеф. | ст-ст | | |
|----|-------------------------|------|---------|--------|-------|-------|-----|
| 1. | МАТЕРИАЛИ | | | | | | |
| | БОРДЮРИ БЕТОНОВИ - 8/10 | м | 1.000 | 15.00 | 1.000 | 15.00 | лв. |
| 2. | БЕТОН М 100 - ОБИКНОВЕН | м3 | 0.003 | 100.00 | 1.000 | 0.25 | лв. |
| | | | | | | 15.25 | лв. |
| | ТРУД | | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.654 | 3.80 | 1.000 | 2.49 | лв. |
| 2. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.412 | 3.80 | 1.000 | 1.57 | лв. |
| | | | | | | 4.06 | лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | м-ли | | 8.00 % | 1.22 | | | |
| | м-ция | | 25.00 % | 0.00 | | | |
| | труд | | 90.00 % | 3.65 | | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 4.87 | лв. |
| | печалба | | 7.00 % | | | 1.69 | лв. |
| | ВСИЧКО: | | | | | 25.87 | лв. |



Анализ *000000006

Доставка и монтаж на дървени пейки с метална конструкция и облегалка (размери за 1 бр.

| | | р.н. | цена | коэф. | ст-ст | |
|----|---|------|---------|--------|-------|--------------------------|
| 1. | МАТЕРИАЛИ ДЪРВЕНИ ПЕЙКИ С МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ И ОБЛЕГАЛКА | бр. | 1.000 | 250.00 | 1.000 | 250.00 лв. 250.00 лв. |
| | ТРУД | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.698 | 3.80 | 1.000 | 2.65 лв. |
| 2. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.987 | 3.80 | 1.000 | 3.75 лв. |
| | | | | | 6.40 | лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | м-ли | | 8.00 % | 20.00 | | |
| | м-ция | | 25.00 % | 0.00 | | |
| | труд | | 90.00 % | 5.76 | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 25.76 лв. |
| | печалба | | 7.00 % | | | 19.75 лв. |
| | ВСИЧКО: | | | | | 301.91 лв. |

Анализ *000000007

Доставка и монтаж на кошчета за отпадъци р-р 45/80см; за 1 бр.

| | | р.н. | цена | коэф. | ст-ст | |
|----|--|------|---------|--------|-------|--------------------------|
| 1. | МАТЕРИАЛИ КОШЧЕТА ЗА ОТПАДЪЦИ Р-Р 45/80СМ; | бр. | 1.000 | 100.00 | 1.000 | 100.00 лв. 100.00 лв. |
| | ТРУД | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.654 | 3.80 | 1.000 | 2.49 лв. |
| 2. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.875 | 3.80 | 1.000 | 3.32 лв. |
| | | | | | 5.81 | лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | м-ли | | 8.00 % | 8.00 | | |
| | м-ция | | 25.00 % | 0.00 | | |
| | труд | | 90.00 % | 5.23 | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 13.23 лв. |
| | печалба | | 7.00 % | | | 8.33 лв. |
| | ВСИЧКО: | | | | | 127.37 лв. |

Анализ *000000009

Доставка и полагане на противоударна настилка в детска площадка, в т.ч. подложе



00129

за 1 м2

| | МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коэф. | ст-ст | |
|----|------------------------|------|---------|-------|-------|-------|-----|
| 1. | ПРОТИВОУДАРНА НАСТИЛКА | м2 | 1.000 | 38.00 | 1.000 | 38.00 | лв. |
| | | | | | | 38.00 | лв. |
| | ТРУД | | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.365 | 3.80 | 1.000 | 1.39 | лв. |
| 2. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.652 | 3.80 | 1.000 | 2.48 | лв. |
| | | | | | | 3.87 | лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | м-ли | | 8.00 % | 3.04 | | | |
| | м-ция | | 25.00 % | 0.00 | | | |
| | труд | | 90.00 % | 3.48 | | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 6.52 | лв. |
| | печалба | | 7.00 % | | | 3.39 | лв. |
| | ВСИЧКО: | | | | | 51.78 | лв. |

Анализ *000000010
Детска пързалка
за 1 бр.

| | МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коэф. | ст-ст | |
|----|-----------------|------|---------|----------|-------|----------|-----|
| 1. | ДЕТСКА ПЪРЗАЛКА | бр. | 1.000 | 1 800.00 | 1.000 | 1 800.00 | лв. |
| | | | | | | 1 800.00 | лв. |
| | ТРУД | | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 1.230 | 3.80 | 1.000 | 4.67 | лв. |
| 2. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 1.360 | 3.80 | 1.000 | 5.17 | лв. |
| | | | | | | 9.84 | лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | м-ли | | 8.00 % | 144.00 | | | |
| | м-ция | | 25.00 % | 0.00 | | | |
| | труд | | 90.00 % | 8.86 | | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 152.86 | лв. |
| | печалба | | 7.00 % | | | 137.39 | лв. |
| | ВСИЧКО: | | | | | 2 100.09 | лв. |

Анализ *000000011

Комбинирана детска люлка с две
места за люлеене тип махало
за 1 бр.

| | МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коэф. | ст-ст | |
|----|--|-----|-------|----------|-------|----------|-----|
| 1. | КОМБИНИРАНА ДЕТСКА ЛЮЛКА С ДВЕ МЕСТА ЗА ЛЮЛЕЕНЕ ТИП | бр. | 1.000 | 1 900.00 | 1.000 | 1 900.00 | лв. |
| | | | | | | 1 900.00 | лв. |



| | | | | | | | |
|------|----------------|------|-------|------|-------|-------|-----|
| ТРУД | | | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 2.365 | 3.80 | 1.000 | 8.99 | лв. |
| 2. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 2.687 | 3.80 | 1.000 | 10.21 | лв. |
| | | | | | | 19.20 | лв. |

ДОП.РАЗХОДИ:

| | | | | | | | |
|----------------|---------|--------|--|--|--|----------|-----|
| м-ли | 8.00 % | 152.00 | | | | | |
| м-ция | 25.00 % | 0.00 | | | | | |
| труд | 90.00 % | 17.28 | | | | | |
| доп.р-ди (вс.) | | | | | | 169.28 | лв. |
| печалба | 7.00 % | | | | | 146.19 | лв. |
| ВСИЧКО: | | | | | | 2 234.67 | лв. |

Анализ *000000012

Детска клатушка
за 1 бр.

| | | | | | | | |
|-----------|-----------------|-----|-------|--------|-------|--------|-----|
| МАТЕРИАЛИ | | | | | | | |
| 1. | ДЕТСКА КЛАТУШКА | бр. | 1.000 | 980.00 | 1.000 | 980.00 | лв. |
| | | | | | | 980.00 | лв. |

ТРУД

| | | | | | | | |
|----|----------------|------|-------|------|-------|------|-----|
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.687 | 3.80 | 1.000 | 2.61 | лв. |
| 2. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.558 | 3.80 | 1.000 | 2.12 | лв. |
| | | | | | | 4.73 | лв. |

ДОП.РАЗХОДИ:

| | | | | | | | |
|----------------|---------|-------|--|--|--|----------|-----|
| м-ли | 8.00 % | 78.40 | | | | | |
| м-ция | 25.00 % | 0.00 | | | | | |
| труд | 90.00 % | 4.26 | | | | | |
| доп.р-ди (вс.) | | | | | | 82.66 | лв. |
| печалба | 7.00 % | | | | | 74.72 | лв. |
| ВСИЧКО: | | | | | | 1 142.11 | лв. |


Анализ *000000013

Изкоп за детски пясъчник на 40 см
дълбочина
за 1 м3

| | | | | | | | |
|------|----------------|------|-------|------|-------|------|-----|
| ТРУД | | | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.652 | 3.80 | 1.000 | 2.48 | лв. |
| 2. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.554 | 3.80 | 1.000 | 2.11 | лв. |
| | | | | | | 4.59 | лв. |

ДОП.РАЗХОДИ:

| | | | | | | | |
|----------------|---------|------|--|--|--|------|-----|
| м-ли | 8.00 % | 0.00 | | | | | |
| м-ция | 25.00 % | 0.00 | | | | | |
| труд | 90.00 % | 4.13 | | | | | |
| доп.р-ди (вс.) | | | | | | 4.13 | лв. |
| печалба | 7.00 % | | | | | 0.61 | лв. |

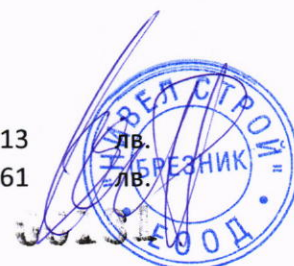

ВСИЧКО: 9.33 лв.

Анализ *000000014

Доставка и полагане на бетон по контур на детски пясъчник вкл. кофраж и армиров за 1 м3

| | МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коэф. | ст-ст | |
|----|--|------|---------|--------|-------|--------|-----|
| 1. | БЕТОН В15 | м3 | 1.000 | 120.00 | 1.000 | 120.00 | лв. |
| 2. | АРМИРОВКА СТОМАНА Ат С ДИАМЕТЪР ДО 12ММ | кг | 20.000 | 1.20 | 1.000 | 24.00 | лв. |
| | | | | | | 144.00 | лв. |
| | ТРУД | | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.654 | 3.80 | 1.000 | 2.49 | лв. |
| 2. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 1.236 | 3.80 | 1.000 | 4.70 | лв. |
| | | | | | | 7.19 | лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | м-ли | | 8.00 % | 11.52 | | | |
| | м-ция | | 25.00 % | 0.00 | | | |
| | труд | | 90.00 % | 6.47 | | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 17.99 | лв. |
| | печалба | | 7.00 % | | | 11.84 | лв. |
| | ВСИЧКО: | | | | | 181.02 | лв. |

Анализ *000000015

Полагане на геотекстил и чакъл с фракция, по-голяма от 8 mm, за дренаж под наст за 1 м2

| | МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коэф. | ст-ст | |
|----|----------------|------|---------|------|-------|-------|-----|
| 1. | ГЕОТЕКСТИЛ | м2 | 1.000 | 1.80 | 1.000 | 1.80 | лв. |
| | | | | | | 1.80 | лв. |
| | ТРУД | | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.052 | 3.80 | 1.000 | 0.20 | лв. |
| 2. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.012 | 3.80 | 1.000 | 0.05 | лв. |
| | | | | | | 0.25 | лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | м-ли | | 8.00 % | 0.14 | | | |
| | м-ция | | 25.00 % | 0.00 | | | |
| | труд | | 90.00 % | 0.22 | | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 0.36 | лв. |
| | печалба | | 7.00 % | | | 0.17 | лв. |
| | ВСИЧКО: | | | | | 2.58 | лв. |



Анализ *000000016

Доставка и разстилане на промит
пясък с фракция от 0,2 до 2 mm
(дебелина 30см);
за 1 м3

| | МАТЕРИАЛИ | р.н. | цена | коэф. | ст-ст | | |
|----|--|------|---------|-------|-------|-------|-----|
| 1. | ПРОМИТ ПЯСЪК С ФРАКЦИЯ ОТ 0,2 ДО 2 ММ | м3 | 1.000 | 15.00 | 1.000 | 15.00 | лв. |
| | | | | | | 15.00 | лв. |
| | ТРУД | | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.325 | 3.80 | 1.000 | 1.23 | лв. |
| 2. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.214 | 3.80 | 1.000 | 0.81 | лв. |
| | | | | | | 2.04 | лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | м-ли | | 8.00 % | 1.20 | | | |
| | м-ция | | 25.00 % | 0.00 | | | |
| | труд | | 90.00 % | 1.84 | | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 3.04 | лв. |
| | печалба | | 7.00 % | | | 1.41 | лв. |
| | ВСИЧКО: | | | | | 21.49 | лв. |

Анализ *000000017

Доставка и монтаж на дървена
шапка по контур на детски пясъчник
за 1 м

| | МАТЕРИАЛИ | р.н. | цена | коэф. | ст-ст | | |
|----|----------------|------|---------|-------|-------|-------|-----|
| 1. | ДЪРВЕНА ШАПКА | м | 1.000 | 10.00 | 1.000 | 10.00 | лв. |
| | | | | | | 10.00 | лв. |
| | ТРУД | | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.230 | 3.80 | 1.000 | 0.87 | лв. |
| 2. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.145 | 3.80 | 1.000 | 0.55 | лв. |
| | | | | | | 1.42 | лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | м-ли | | 8.00 % | 0.80 | | | |
| | м-ция | | 25.00 % | 0.00 | | | |
| | труд | | 90.00 % | 1.28 | | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 2.08 | лв. |
| | печалба | | 7.00 % | | | 0.94 | лв. |
| | ВСИЧКО: | | | | | 14.44 | лв. |

Анализ *000000018



Доставка и монтаж на дървена
предпазна ограда с височина 1.00м ;
с две врати ши
за 1 м

| МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коэф. | ст-ст | | |
|--------------|--------------------------|------|---------|-------|-------|-------|-----|
| 1. | ДЪРВЕНА ПРЕДПАЗНА ОГРАДА | м | 1.000 | 56.00 | 1.000 | 56.00 | лв. |
| | | | | | | 56.00 | лв. |
| ТРУД | | | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.365 | 3.80 | 1.000 | 1.39 | лв. |
| 2. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.214 | 3.80 | 1.000 | 0.81 | лв. |
| | | | | | | 2.20 | лв. |
| ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | | |
| | м-ли | | 8.00 % | 4.48 | | | |
| | м-ция | | 25.00 % | 0.00 | | | |
| | труд | | 90.00 % | 1.98 | | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 6.46 | лв. |
| | печалба | | 7.00 % | | | 4.53 | лв. |
| | ВСИЧКО: | | | | | 69.19 | лв. |

Анализ *000000019
Доставка и монтаж на
Информационна табела
(мин.110/150 см.)
за 1 бр.

| МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коэф. | ст-ст | | |
|--------------|----------------------|------|---------|--------|-------|--------|-----|
| 1. | ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА | бр. | 1.000 | 120.00 | 1.000 | 120.00 | лв. |
| | | | | | | 120.00 | лв. |
| ТРУД | | | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.325 | 3.80 | 1.000 | 1.23 | лв. |
| 2. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.541 | 3.80 | 1.000 | 2.06 | лв. |
| | | | | | | 3.29 | лв. |
| ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | | |
| | м-ли | | 8.00 % | 9.60 | | | |
| | м-ция | | 25.00 % | 0.00 | | | |
| | труд | | 90.00 % | 2.96 | | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 12.56 | лв. |
| | печалба | | 7.00 % | | | 9.51 | лв. |
| | ВСИЧКО: | | | | | 145.36 | лв. |

Анализ *000000020
Почистване, изораване и фрезоване
на зелените площи;
за 1 бр.



00134

| МЕХАНИЗАЦИЯ | | | р.н. | цена | коэф. | ст-ст | |
|--------------|----------------|------|---------|-------|-------|-------|-----|
| 1. | ФРЕЗА | мсм | 0.020 | 56.00 | 1.000 | 1.12 | лв. |
| | | | | | | 1.12 | лв. |
| ТРУД | | | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 1.241 | 3.80 | 1.000 | 4.72 | лв. |
| 2. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 1.365 | 3.80 | 1.000 | 5.19 | лв. |
| | | | | | | 9.91 | лв. |
| ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | | |
| | м-ли | | 8.00 % | 0.00 | | | |
| | м-ция | | 25.00 % | 0.28 | | | |
| | труд | | 90.00 % | 8.92 | | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 9.20 | лв. |
| | печалба | | 7.00 % | | | 1.42 | лв. |
| | ВСИЧКО: | | | | | 21.65 | лв. |

Анализ *000000021
Внасяне на обогатен почвен
субстрат (10см);
за 1 м3

| МАТЕРИАЛИ | | | р.н. | цена | коэф. | ст-ст | |
|--------------|--------------------------|------|---------|--------|-------|-------|-----|
| 1. | ОБОГАТЕН ПОЧВЕН СУБСТРАТ | м3 | 1.000 | 18.00 | 1.000 | 18.00 | лв. |
| | | | | | | 18.00 | лв. |
| МЕХАНИЗАЦИЯ | | | | | | | |
| 1. | САМОСВАЛ | мсм | 0.002 | 150.00 | 1.000 | 0.30 | лв. |
| | | | | | | 0.30 | лв. |
| ТРУД | | | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.236 | 3.80 | 1.000 | 0.90 | лв. |
| 2. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.658 | 3.80 | 1.000 | 2.50 | лв. |
| | | | | | | 3.40 | лв. |
| ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | | |
| | м-ли | | 8.00 % | 1.44 | | | |
| | м-ция | | 25.00 % | 0.08 | | | |
| | труд | | 90.00 % | 3.06 | | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 4.58 | лв. |
| | печалба | | 7.00 % | | | 1.84 | лв. |
| | ВСИЧКО: | | | | | 28.12 | лв. |

Анализ *000000022
Провеждане на санитарни и
оформящи резитби на
съществуващи широколистни
дървета
за 1 бр.

ТРУД р.н. цена коэф. ст-ст



00135

| | | | | | | | |
|----|----------------|------|-------|------|-------|------|-----|
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.874 | 3.80 | 1.000 | 3.32 | лв. |
| 2. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.562 | 3.80 | 1.000 | 2.14 | лв. |
| | | | | | | 5.46 | лв. |

ДОП.РАЗХОДИ:

| | | | | | | | |
|----------------|---------|------|--|--|--|-------|-----|
| м-ли | 8.00 % | 0.00 | | | | | |
| м-ция | 25.00 % | 0.00 | | | | | |
| труд | 90.00 % | 4.91 | | | | | |
| доп.р-ди (вс.) | | | | | | 4.91 | лв. |
| печалба | 7.00 % | | | | | 0.73 | лв. |
| ВСИЧКО: | | | | | | 11.10 | лв. |

Анализ *000000023

Затревяване,валиране,
поливане,торене,плевене и косене
до втора коситба вкл.
за 1 м2

| | | | | | | | |
|-----------|-------------|----|-------|-------|-------|------|-----|
| МАТЕРИАЛИ | | | | | | | |
| 1. | ТРЕВНО СЕМЕ | кг | 0.010 | 10.20 | 1.000 | 0.10 | лв. |
| 2. | ВОДА | кг | 1.200 | 1.10 | 1.000 | 1.32 | лв. |
| | | | | | | 1.42 | лв. |

МЕХАНИЗАЦИЯ

| | | | | | | | |
|----|---------|-----|-------|-------|-------|------|-----|
| 1. | КОСАЧКА | мсм | 0.004 | 36.00 | 1.000 | 0.14 | лв. |
| 2. | ВАЛЯК | мсм | 0.004 | 42.00 | 1.000 | 0.17 | лв. |
| | | | | | | 0.31 | лв. |

ТРУД

| | | | | | | | |
|----|----------------|------|-------|------|-------|------|-----|
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.325 | 3.80 | 1.000 | 1.23 | лв. |
| 2. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.524 | 3.80 | 1.000 | 1.99 | лв. |
| | | | | | | 3.22 | лв. |

ДОП.РАЗХОДИ:

| | | | | | | | |
|----------------|---------|------|--|--|--|------|-----|
| м-ли | 8.00 % | 0.11 | | | | | |
| м-ция | 25.00 % | 0.08 | | | | | |
| труд | 90.00 % | 2.90 | | | | | |
| доп.р-ди (вс.) | | | | | | 3.09 | лв. |
| печалба | 7.00 % | | | | | 0.56 | лв. |
| ВСИЧКО: | | | | | | 8.60 | лв. |

Анализ *000000024

Доставка и засаждане на
иглолистни дървета с височина 1.5
м.
за 1 бр.

| | | | | | | | |
|-----------|---|-----|-------|------|-------|------|-----|
| МАТЕРИАЛИ | | | | | | | |
| 1. | ИГЛОЛИСТНИ ДЪРВЕТА С ВИСОЧИНА 1.5 М. | бр. | 1.000 | 6.80 | 1.000 | 6.80 | лв. |



00136

| | | | | | | | |
|----|----------------|------|---------|------|-------|-------|-----|
| | | | | | | 6.80 | лв. |
| | ТРУД | | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.324 | 3.80 | 1.000 | 1.23 | лв. |
| 2. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.254 | 3.80 | 1.000 | 0.97 | лв. |
| | | | | | | 2.20 | лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | м-ли | | 8.00 % | 0.54 | | | |
| | м-ция | | 25.00 % | 0.00 | | | |
| | труд | | 90.00 % | 1.98 | | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 2.52 | лв. |
| | печалба | | 7.00 % | | | 0.81 | лв. |
| | ВСИЧКО: | | | | | 12.33 | лв. |

Анализ *000000025


Доставка и засаждане на широколистни дървета с височина 2.5 за 1 бр.

| | | | | | | | |
|----|------------------------|------|---------|------|-------|-------|-----|
| | МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коэф. | ст-ст | |
| | ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕТА С | | | | | | |
| | ВИСОЧИНА 2.5 | бр. | 1.000 | 8.50 | 1.000 | 8.50 | лв. |
| 1. | | | | | | 8.50 | лв. |
| | ТРУД | | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.321 | 3.80 | 1.000 | 1.22 | лв. |
| 2. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.365 | 3.80 | 1.000 | 1.39 | лв. |
| | | | | | | 2.61 | лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | м-ли | | 8.00 % | 0.68 | | | |
| | м-ция | | 25.00 % | 0.00 | | | |
| | труд | | 90.00 % | 2.35 | | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 3.03 | лв. |
| | печалба | | 7.00 % | | | 0.99 | лв. |
| | ВСИЧКО: | | | | | 15.13 | лв. |

Анализ *000000026

Доставка и засаждане на храсти с височина 0.6 - 0.8 м за 1 бр.

| | | | | | | | |
|----|-------------------------------|------|-------|------|-------|-------|-----|
| | МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коэф. | ст-ст | |
| | ХРАСТИ С ВИСОЧИНА 0.6 - 0.8 М | бр. | 1.000 | 3.40 | 1.000 | 3.40 | лв. |
| 1. | | | | | | 3.40 | лв. |
| | ТРУД | | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.236 | 3.80 | 1.000 | 0.90 | лв. |
| 2. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.354 | 3.80 | 1.000 | 1.35 | лв. |



| | | | | | | |
|----------------|--|---------|------|--|------|-----|
| | | | | | 2.25 | лв. |
| ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| м-ли | | 8.00 % | 0.27 | | | |
| м-ция | | 25.00 % | 0.00 | | | |
| труд | | 90.00 % | 2.03 | | | |
| доп.р-ди (вс.) | | | | | 2.30 | лв. |
| печалба | | 7.00 % | | | 0.56 | лв. |
| ВСИЧКО: | | | | | 8.51 | лв. |

Анализ *000000027
Изготвяне на строителни книжа
за 1 бр.

| | | | | | | | |
|--------------|----------------|-----|---------|----------|-------|----------|-----|
| 1. | МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коэф. | ст-ст | |
| | ПРОЕКТИ | бр. | 1.000 | 1 100.00 | 1.000 | 1 100.00 | лв. |
| | | | | | | 1 100.00 | лв. |
| ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | | |
| | м-ли | | 8.00 % | 88.00 | | | |
| | м-ция | | 25.00 % | 0.00 | | | |
| | труд | | 90.00 % | 0.00 | | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 88.00 | лв. |
| | печалба | | 7.00 % | | | 83.16 | лв. |
| | ВСИЧКО: | | | | | 1 271.16 | лв. |

Анализ *000000001

Провеждане на санитарни и
оформящи резитби на
съществуващи храсти вкл. извозван
за 1 бр.

| | | | | | | | |
|--------------|----------------|------|---------|--------|-------|-------|-----|
| 1. | МЕХАНИЗАЦИЯ | | р.н. | цена | коэф. | ст-ст | |
| | САМОСВАЛ | мсм | 0.002 | 150.00 | 1.000 | 0.30 | лв. |
| | | | | | | 0.30 | лв. |
| ТРУД | | | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.658 | 3.80 | 1.000 | 2.50 | лв. |
| 2. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.896 | 3.80 | 1.000 | 3.41 | лв. |
| | | | | | | 5.91 | лв. |
| ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | | |
| | м-ли | | 8.00 % | 0.00 | | | |
| | м-ция | | 25.00 % | 0.08 | | | |
| | труд | | 90.00 % | 5.32 | | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 5.40 | лв. |
| | печалба | | 7.00 % | | | 0.81 | лв. |
| | ВСИЧКО: | | | | | 12.42 | лв. |



15.04.2016 г

Велко Руйков

